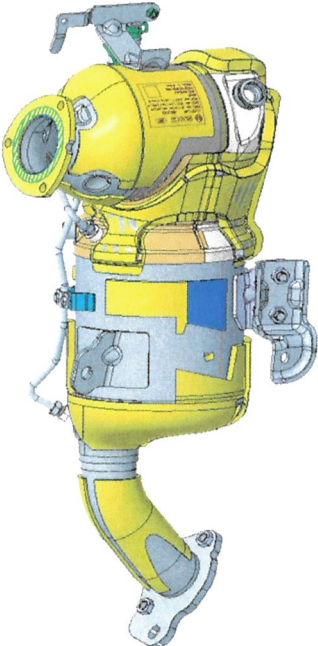
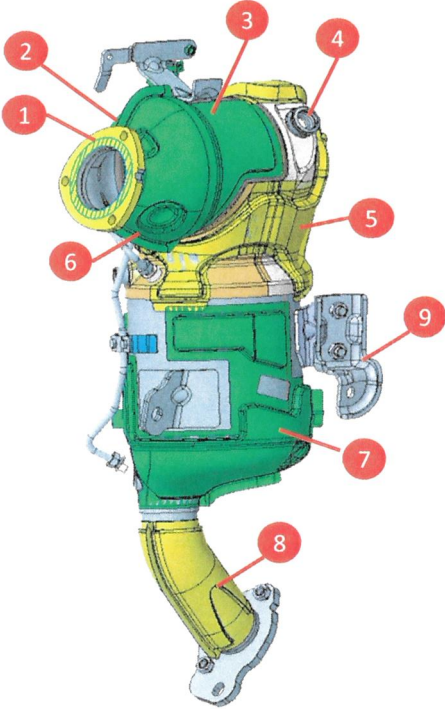
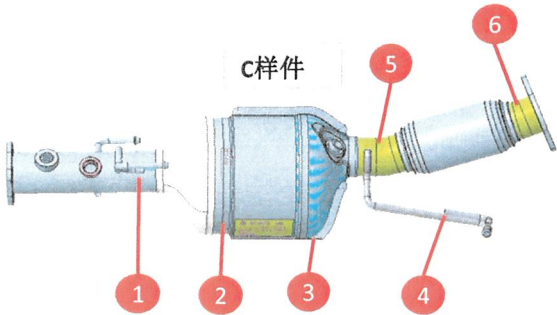
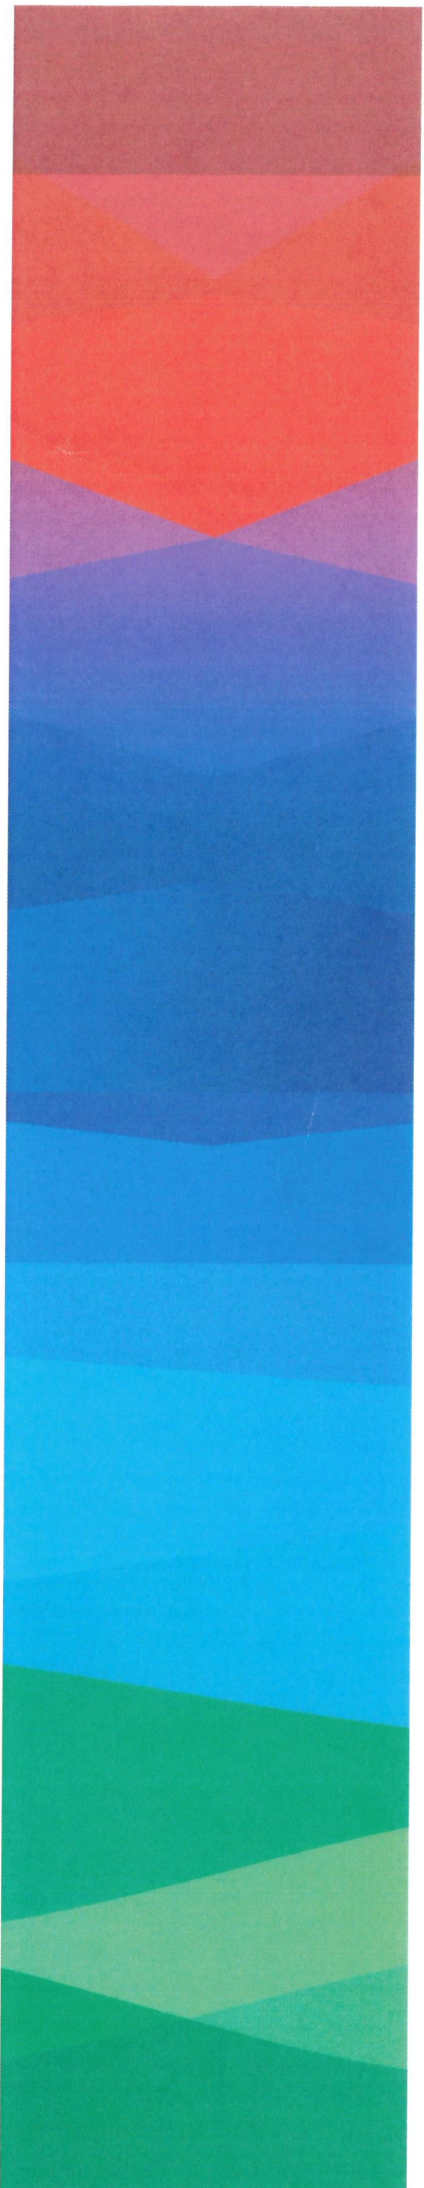


 BOSCH 博世	Product Development Design Change Request 产品开发设计变更请求		Version 15 Effective date: 2025-05-10th
	Confidential		Design Change Request No. 25_032
Customer project Name/ 客户项目名称: JIM-4JJ MCR No. / MCR号:			
Sample status / 样件状态: ☐ A Sample ☐ B Sample ☒ C Sample ☐ D Sample			
Change part&product Name/更改零部件产品的名称(简要描述)			
DOC+SDPF新鲜件(不可拆): F01ZH003EA-03 675 SCR新鲜件: F01ZH003EB-05			
Reason of changes/更改理由(简要描述): 依据客户需求, 提供 JIE-4JJ C样OTS件;			
Change from/变更来源:			
Customer request / 客户要求 ☒		Supplier request / 供应商请求 ☐	Design optimization / 设计优化 ☐
Correction / 更正(错误) ☐		Other / 其他 ☐ ()	
Change inform to/变更通知人: Zhang Shengchang,Zhang Hanquan,Shen Weibo, Li Yicen, Fang Jiayan, Yin Kangzhuang Yang Guangtuo,Jia Kebin, Luo jing, Lu Qingsong,Xie Youfu			
Whether this change impact others component or product 此变更是否影响到其他部件和产品: ☐ yes/是 ☒ no/否			
If impact others product, Whether others projects&product change or not? 如果影响, 别的部件和产品是否也需要同时变更?			
Design / 设计工程师 Signature / 签名: 马坤阳		Date / 日期: 2025.08.05	
Check / 校对工程师 Signature / 签名: 杨广拓		Date / 日期: 2025.08.27	
Description of Change/更改描述: (下面空白处请列出详细的变更前后对比)			
B样件  C样件  具体变更详见附件 DOC DPF 主要变更点如下: 1.进气法兰加厚2mm 2.进气端锥进气口直径增大4mm, 长度减短4mm 3.DOC-canning 不共用493, 筒体缩短 4.喷嘴座缺口位置调整 5.混合器保温共用493 6.新开DOC模具件保温 7.新开DPF模具件保温 8.新开尾管模具件保温 (暂定不开) 9.侧支架依据模具供应商要求调整 SCR 主要变更点如下: 1.尾管长度增长 2.封装筒体缩短 3.保温壳需要折弯 4.吊钩更改 5.6. 进气管微调 B样件  C样件 			


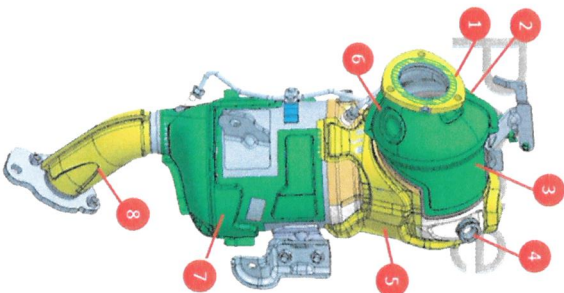
 博世 Confidential	Design Change Review Sheet 设计变更评审表		Version 13 Effective date: 2025-05-10th	
			Design Change Request No.	
1. Function&Performance will be influenced? / 系统性能影响? ☐ yes/是 ☒ no/否				
If Yes, System impact evaluation? 如果是, 系统影响评估? (如果是初次样件放行, 空白处请说明样件目的)		AIS POC 已完成		
Whether need sample to test? Plan? 是否需要样件进行验证? 计划?		NA		System/签名 沈伟波
Whether the catalyst information is confirmed? 催化剂信息是否确认? (物料号、图纸、SPEC)		同 493 催化剂		Catalyst/签名 张江泉
2. Interface&boundary (internal and customer) will be influenced? / 接口&边界(内部和客户)影响? ☐ yes/是 ☒ no/否				
If impact customer ,whether get confirm from customer side? 请说明影响和是否得到客户的确认?		客户已确认		Design /签名 马坤阳
3. Mechanical strength&Durability will be influenced? / 机械强度&可靠性影响? ☐ yes/是 ☒ no/否				
If Yes, How to evaluate? Plan? 如果是, 请说明影响和如何评估,计划? (例如:仿真分析等)				
Whether need sample to test? Plan? 是否需要样件进行验证? 计划?		DV finished. results passed		Validation/签名 XuRun
4. Product document influenced?				
4.1 Interface FMEA-relevant / IFMEA:		☐ no/否 ☐ yes/是	Note	
4.2. Product FMEA-relevant / DFMEA:		☐ no/否 ☐ yes/是	Note	
4.3. Special Charecteristics /PSC: (针对C Sample)		☐ no/否 ☐ yes/是	Note	
4.4. IMDS relevant: (针对C Sample)		☐ no/否 ☐ yes/是	Note	
4.5 Offer drawing relevant:(针对C Sample)		☐ no/否 ☐ yes/是	Note	
4.6. TCD relevant:		☐ no/否 ☐ yes/是	Note	Design /签名
5. Changed parts Stock& treatment / 需要变更零件的库存统计和处理? ☐ NA.(新零件放行,不涉及库存) (只针对涉及到已经生产过的零件变更, 新放行零件和本条不相关) ☐ 涉及到已经生产过的零件变更				
RBCW RDC(外库)和RBCW 仓库, 是否有库存,		☐ 无库存 ☐ 有库存, 库存数量		
供应商处(已做好, 未发货)是否有库存,		☐ 无库存 ☐ 有库存, 库存数量		
LPN工厂是否有库存,		☐ 无库存 ☐ 有库存, 库存数量		
在途, 运输中是否有库存		☐ 无库存 ☐ 有库存, 库存数量		PUE /签名 李亮
被影响到的实物库存处理指示: (设计工程师组织会议讨论)		☐ 可以继续使用完 ☐ 改制后使用 ☐ 报废		Design /签名
		☐ 改制费用; ☐ 报废成本;		PUE /签名 李亮
已装车件处理方法 (发客户或标定车等) (SMP组织会议讨论)		☐ 改制; ☐ 更换; 其他 (单独说明);		
6. Influence on supplier part?				
Was this change confirmed with Purchasing (Supplier) for feasibility? Feedback from Supplier? 变更后的零件, 生产可行性供应商是否确认? 反馈?				
Influence on purchasing part delivery time? 对采购件交货时间的影响?				
涉及到变更的零件, 博世已出PR, 供应商还未来得及生产的订单, 是否已经通知供应商取消. ☐ no/否 ☐ yes/是				
Does the change influence on purchasing cost? 变更对采购成本的影响?				
☐ increase/增加,金额 ☐ decrease/降低,金额 ☐ no change/不变				
PUE/签名 李亮				
7. DFMA & Sample prodction OPL?				
必要时附加DFMA 文件				
无 OPL				
Design /签名 马坤阳				
8. Influence on LPN manufacturing&assembly process?				
Feedback from manufacturing engineer? 生产制造装配是否影响, 反馈?				
Influence on project&product delivery time? 对项目&产品交货时间的影响?				
OIS 量产报价 850				
Influence on manufacturing cost / 对生产成本的影响?				
☐ increase/增加,金额 ☐ decrease/降低,金额 ☐ no change/不变				
PUE/签名 李亮				
9. PM alignment? (Influence on project Timeline? Cost?);				
是否同意对项目时间和成本的影响; 需求样品订单数量				
PM/签名 李亮				
10. 如果涉及以下情况需TCR3 审核确认。 不涉及则 NA: ☐ ☐ 库存报废,金额; ☐ 采购成本增加,金额; ☐ 生产成本增加,金额				
RBCW/TCR3				
Design Team Leader		ENG-CV1	PUR	TCR3
Signature / 签名: 杨新		Signature / 签名: 88	Signature / 签名: 2025.8.27	Signature / 签名: 2025-09-02 陈友福



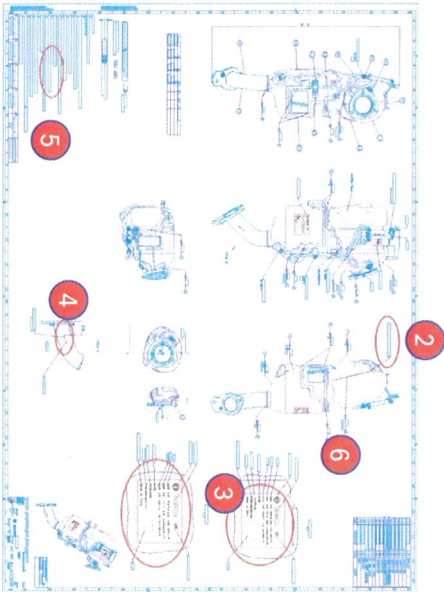
PDEC R25-032 (4JJ1-C 样件)

ENG-CV


PDECR 25-032

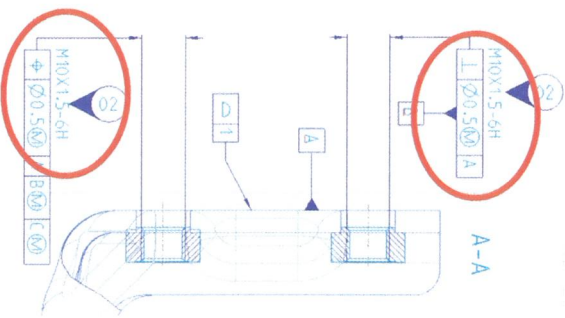
	零件号	零件名称	Project	样件阶段	变更来源
	F01ZH003EA-03	DOC+SDPF UNIT	JIE-4JJ	C	BOSCH/Customer
	变更前后				
变更描述			 DOC DPF 主要变更点如下: 1.进气法兰加厚2mm 2.进气端锥进气口直径增大4mm, 长度 减短4mm 3.DOC-canning 不共用493, 筒体不同 4.喷嘴座缺口位置调整 5.混合器保温共用493 6.新开DOC模具件保温 7.新开DPF模具件保温 8.新开尾管模具件保温		
变更原因	零件更改后处理总成随之更改, 混合器保温可以共用493, 其余6片保温需要新开模具, 样件使用手工包;				
风险点 (影响)	无				
验证方法	无				

PDECR 25-032

	零件号	零件名称	Project	样件阶段	变更来源
	F01ZH003EA-03	DOC+SDPF UNIT	JIE-4JJ	C	BOSCH/Customer
	变更前		变更后		
变更描述	手工保温		 1.由手工保温，改为开模保温 2.定义保温增加铝箔胶带 3.铭牌内容更新 4.生产日期刻印在尾管上 5.焊丝改为439Ti，同量产493 6.定义电阻焊焊点数量 详细更改见图纸		
变更原因	零件更改后后处理总成随之更改，混合器保温可以共用493，其余6片保温需要新开模具，样件使用手工包；				
风险点（影响）	无				
验证方法	无				

PDECR 25-032


零件号		零件名称	Project	样件阶段	变更来源
F01Z5017P5-05		BRACKET	Jle-4JJ	C	BOSCH/Customer
变更前		变更后			
F01Z5017P5-01					
变更描述			 和供应商确认最终可行性OK 更新图纸，螺母增加点焊， 孔径及位置度更新 增加刻字区域 同时后续单独供货		
变更原因	供应商反馈B样件成型困难，需要优化数模				
风险点 (影响)	机械强度不足				
验证方法	FEA仿真结果可以满足要求，见附件				


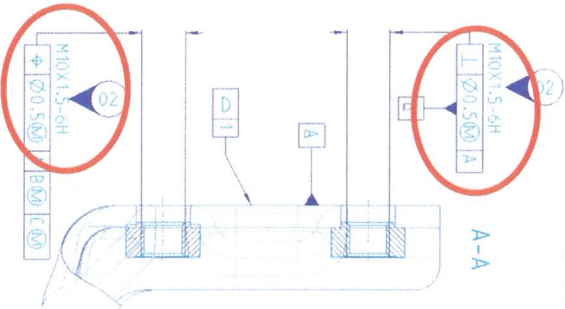


1.F01Z51025V支架孔直径13±0.2收严至12.5±0.2;
2.F01Z5017P5螺母孔垂直度1收严至0.5; 位置度1收严至0.5

客户料号更新
08-20

5JE2501480

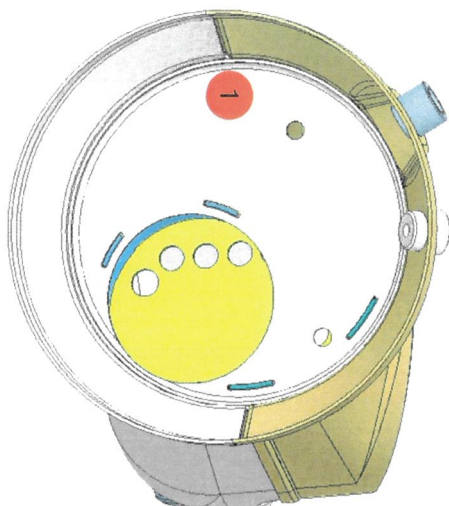





5JE2501480
客户料号更新
08-20

- 1.F01Z51025V 支架孔直径 13 ± 0.2 收 $\text{严至}12.5\pm0.2$;
- 2.F01Z5017P5螺母孔垂直度 1 收 $\text{严至}0.5$; 位置度 1 收 $\text{严至}0.5$

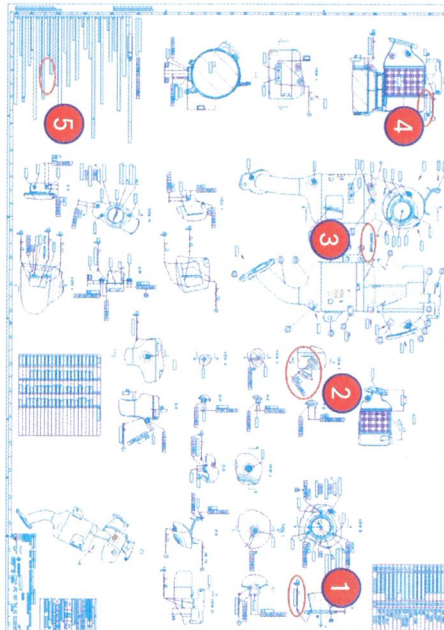
PDEC R 25-032

零件号	零件名称	Project	样件阶段	变更来源
F01Z5017NN-03	MIXER UNIT	JIE-4JJ	C	BOSCH/Customer
变更前			变更后	
变更描述				
变更原因	增加焊缝长度，避免结晶掉落			
风险点 (影响)	无			
验证方法	无			

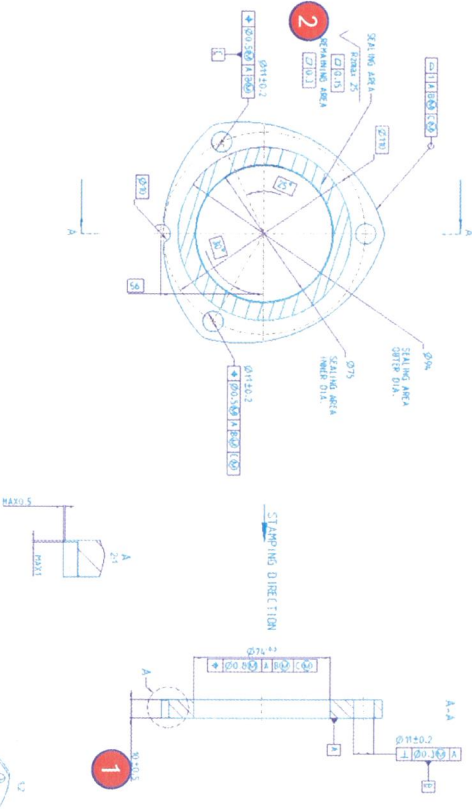
PDECR 25-032

	零件号		零件名称		Project		样件阶段		变更来源	
	F01Z5017NL-03		DOC+SDPF WELDING		JIE-4JJ		C		BOSCH/Customer	
	变更前									
变更描述	F01Z5017NL-02					 零件变更后，焊接组件随之更改； 图纸更改见下页				
变更原因	零件变更后，焊接组件随之更改；									
风险点 (影响)	无									
验证方法	无									

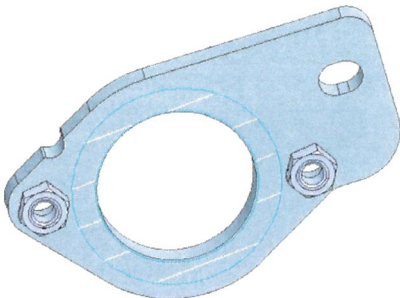
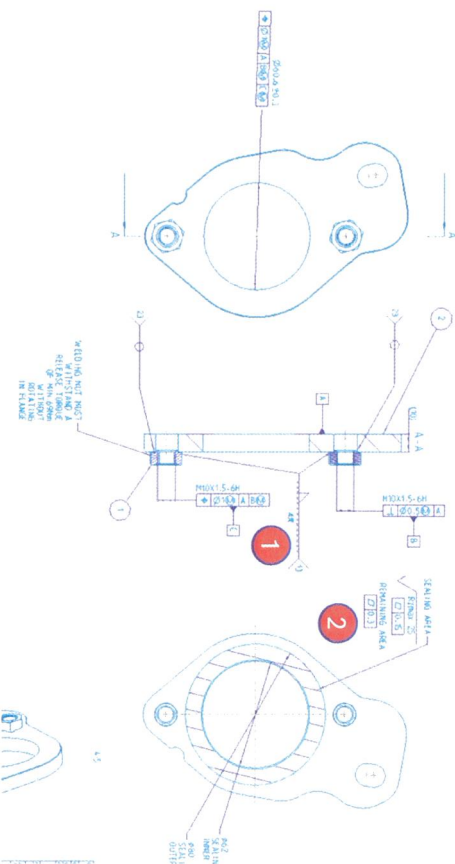
PDECR 25-032

	零件号		零件名称		Project	样件阶段	变更来源
	F01Z5017NL-03		DOC+SDPF WELDING		JIE-4JJ	C	BOSCH/Customer
			变更前		变更后		
变更描述	F01Z5017NL-02		 1.端锥改为内焊 2.定义尿素喷嘴缺口位置度 3.混合器焊缝不允许泄露 4.封装插入深度改为MAX.8 5.焊丝改为439Ti, 同量产493 详细更改见图纸				
变更原因	零件变更后, 焊接组件随之更改;						
风险点 (影响)	无						
验证方法	无						

PDECR 25-032

	零件号		Project	样件阶段	变更来源
	零件名称				
	F01Z510258-03				
变更描述	FLANGE		JIE-4JJ1	C	变更后
	变更前				
					
变更原因	弗吉亚工厂评估，传感器座不好焊接，需要调整焊接顺序，端锥和法兰需要内焊，需要增厚法兰厚度，方便焊接		JIE-4JJ1	C	变更后
	法兰增厚，焊缝强度不足				
					
风险点 (影响)					
验证方法	FEA仿真更改后结果数据，优于更改前数据 (报告见附件)				

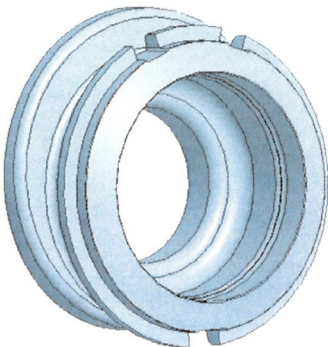
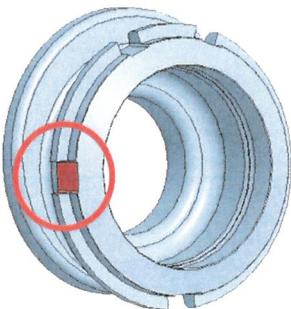
PDECR 25-032

	零件号	零件名称	Project	样件阶段	变更来源
	F01Z5017P4-03	FLANGE	J1E-4JJ1	C	BOSCH/Customer
	变更后				
变更描述			 1.增加点焊 2.平面度更改-同493		
变更原因	弗吉亚工厂评估，螺母不好焊接，需要增加点焊才可以满足脱落要求。平面度更改-同493				
风险点 (影响)	无				
验证方法	无				

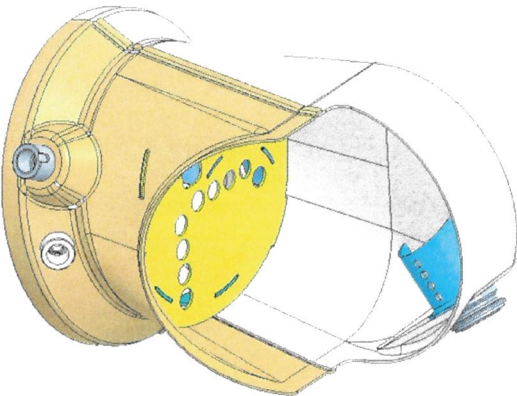
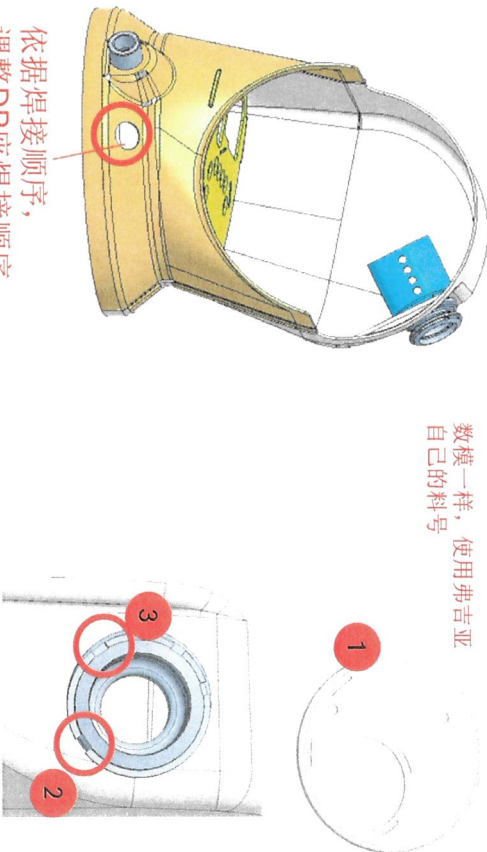
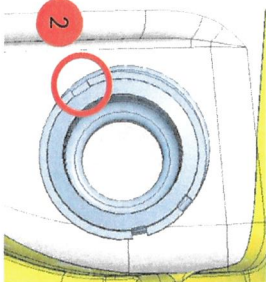
PDECR 25-032

	零件号	零件名称	Project	样件阶段	变更来源
	F01Z510259-03	CONE	JIE-4JJ1	B	BOSCH/Customer
	变更前后				
变更描述	变更前 变更后				
变更原因	1.弗吉亚工厂评估，传感器座不好焊接，需要调整焊接顺序，端锥和法兰需要内焊，需要进气口直线段减短。2.客户要求进气口直径增大				
风险点 (影响)	1.法兰增厚，焊缝强度不足。2.进气口增大影响气流				
验证方法	1.FEA仿真更改后结果数据，优于更改前数据（报告见附件）评估风险较小。2.进气口直径增大王笛评估无影响				



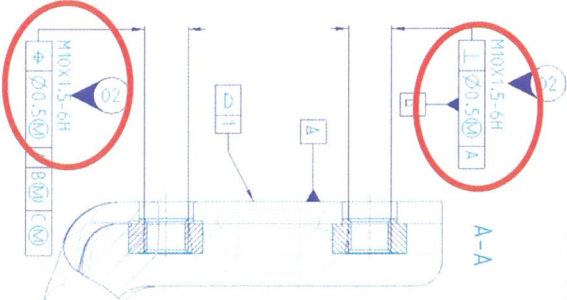

PDECR 25-032

	零件号	零件名称	Project	样件阶段	变更来源
	F01Z5102TD-00	DM flange	J1e-4JJ	C	BOSCH/Customer
	变更前				
变更描述				 增加工艺定位孔 防止和493混料	
变更原因	C样件新开保温				
风险点 (影响)	无				
验证方法	无				

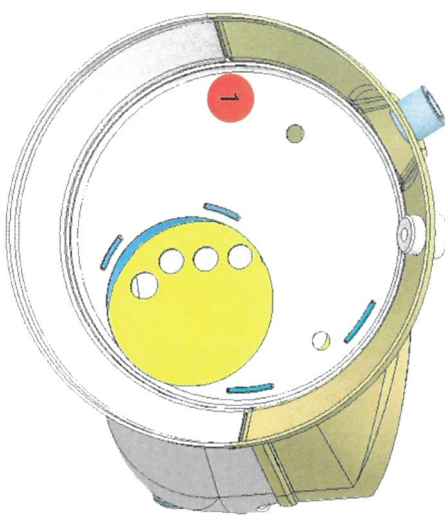
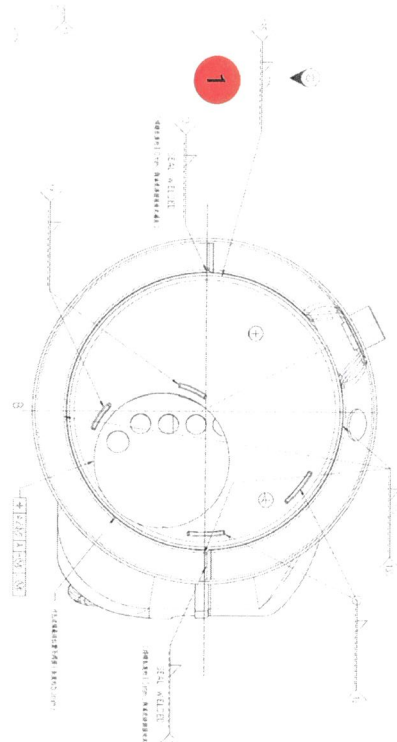
PDECR 25-032

	零件号	零件名称	Project	样件阶段	变更来源
	F01Z5017NN-03	MIXER UNIT	JIE-4JJ	C	BOSCH/Customer
	变更前				
变更描述					
	PLATE: F01Z5101BP				
	DM flange: F01Z5101BR				
					
变更原因	1.共用弗吉亚零件。2.依据客户要求调整喷嘴角度				
风险点 (影响)	无				
验证方法	无				

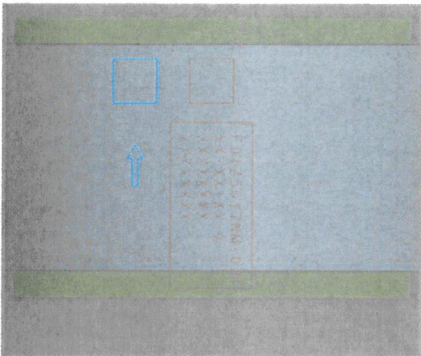
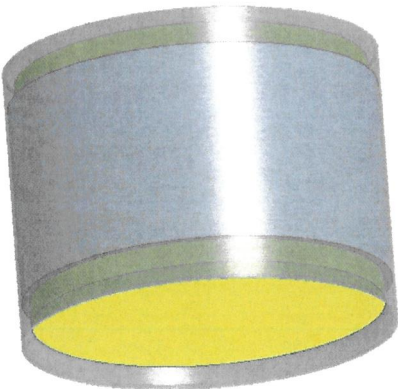
PDECR 25-032

	零件号	零件名称	Project	样件阶段	变更来源
	F01Z5017P5-05	BRACKET	Jle-4JJ	C	BOSCH/Customer
	变更前				
变更描述	F01Z5017P5-01		变更后		
					
	 和供应商确认最终可行性OK 更新图纸，螺母增加点焊， 孔径及位置度更新 增加刻字区域 同时后续单独供货				
					
	 5JE2501480 客户料号更新 08-20 1.F01Z51025V支架孔直径13±0.2收严至12.5±0.2; 2.F01Z5017P5螺母孔垂直度1收严至0.5; 位置度1收严至0.5				
变更原因	供应商反馈B样件成型困难，需要优化数模				
风险点 (影响)	机械强度不足				
验证方法	FEA仿真结果可以满足要求，见附件				

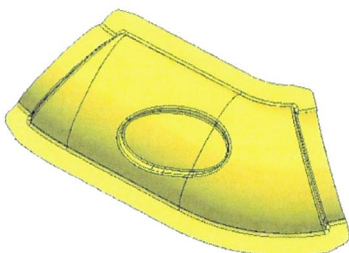
PDECR 25-032

	零件号	零件名称	Project	样件阶段	变更来源
	F01Z5017NN-03	MIXER UNIT	JIE-4JJ	C	BOSCH/Customer
	变更后				
变更描述	变更前		变更后		
			 1.处焊缝由50mm增长为115mm 08-20		
变更原因	增加焊缝长度，避免结晶掉落				
风险点 (影响)	无				
验证方法	无				

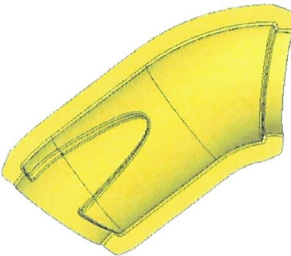
PDECR 25-032

	零件号	零件名称	Project	样件阶段	变更来源
	F01Z5018E4-00	DOC CANNING	J1E-4JJ1	C	BOSCH/Customer
	变更前				
变更描述				变更后	
					
不借用493 C样件 493-C样件筒体已经加长, 4jj无需加长筒体					
变更原因	前期共用493, 为同一个料号, 493后期增加筒体长度, 4jj筒体无需增加, 需要新取一个料号				
风险点 (影响)	无/493项目已经验证OK				
验证方法	无				

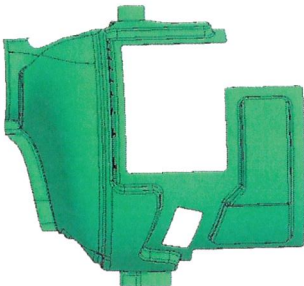
PDECR 25-032

	零件号	零件名称	Project	样件阶段	变更来源
	F01Z5018DR-00	INSULATION	J1e-4JJ	C	BOSCH/Customer
	变更前				
变更描述	手工保温		变更后		
					
			INSULATION WITH MAT: F01Z5018DR-00 FOIL: F01Z5017RM-01 MAT: F01Z5102VJ-00 暂定不开模具		
变更原因	C样件新开保温/				
风险点 (影响)	无				
验证方法	无				

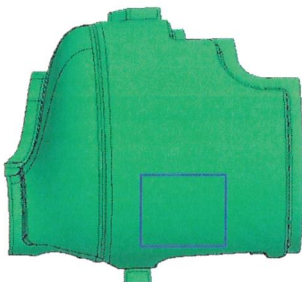
PDECR 25-032

	零件号	零件名称	Project	样件阶段	变更来源
	F01Z5018DS-00	INSULATION	Jle-4JJ	C	BOSCH/Customer
	变更前		变更后		
变更描述	手工保温		 INSULATION WITH MAT: F01Z5018DS-00 FOIL: F01Z5017RN-01 MAT: F01Z5102VK-00 暂定不开模具		
变更原因	C样件新开保温				
风险点 (影响)	无				
验证方法	无				

PDEC R 25-032

	零件号	零件名称	Project	样件阶段	变更来源
	F01Z5018DT-00	INSULATION	J1e-4JJ	C	BOSCH/Customer
	变更前			变更后	
变更描述	手工保温				
				INSULATION WITH MAT: F01Z5018DT-00 FOIL: F01Z5017RP-01 MAT: F01Z5102VL-00 MAT: F01Z5102VU-00 MAT: F01Z5102VW-00 MAT: F01Z5102VV-00 MAT: F01Z5102VS-00 和供应商确认最终可行性OK 更新棉，保温壳图纸	
变更原因	C样件新开保温				
风险点 (影响)	无				
验证方法	无				

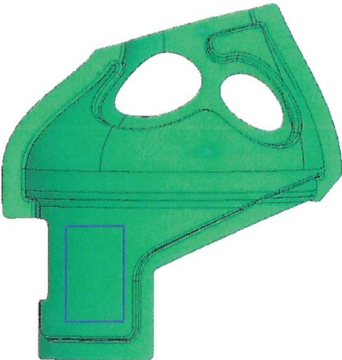
PDECR 25-032

	零件号	零件名称	Project	样件阶段	变更来源
	F01Z5018DU-00	INSULATION	J1e-4JJ	C	BOSCH/Customer
	变更前				
变更描述	手工保温			变更后	
				 INSULATION WITH MAT: F01Z5018DU-00 FOIL: F01Z5017RR-01 MAT: F01Z5102VM-00 MAT:F01Z5102VT-00 和供应商确认最终可行性OK 更新棉，保温壳图纸， 增加刻字压平区域	
变更原因	C样件新开保温				
风险点 (影响)	无				
验证方法	无				

PDECR 25-032

	零件号	零件名称	Project	样件阶段	变更来源
	F01Z5018DV-00	INSULATION	Jle-4JJ	C	BOSCH/Customer
	变更前				
变更描述	手工保温			变更后	
				 INSULATION WITH MAT: F01Z5018DV-00 FOLL: F01Z5017RS-01 MAT: F01Z5102VN-00 和供应商确认最终可行性OK 更新棉，保温壳图纸	
变更原因	C样件新开保温				
风险点 (影响)	无				
验证方法	无				


PDECR 25-032

	零件号	零件名称	Project	样件阶段	变更来源
	F01Z5018DW-00	INSULATION	Jle-4JJ	C	BOSCH/Customer
	变更前				
变更描述	手工保温			变更后	
				 INSULATION WITH MAT: F01Z5018DW-00 FOIL: F01Z5017RT-01 MAT: F01Z5102VP-00 和供应商确认最终可行性OK 更新棉，保温壳图纸， 增加刻字压平区域	
变更原因	C样件新开保温				
风险点 (影响)	无				
验证方法	无				


PDECR 25-032

	零件号	零件名称	Project	样件阶段	变更来源
	F01Z51025D-00	PIPE	Jle-4JJ	C	BOSCH/Customer
	变更前		变更后		
变更描述					
变更原因	依据工厂工艺要求，增加工艺定位孔				
风险点 (影响)	无				
验证方法	无				


PDECR 25-032

	零件号	零件名称	Project	样件阶段	变更来源
	F01Z51025U-02	BOLT	J1e-4JJ	C	BOSCH/Customer
	变更前		变更后		
变更描述			取消		
变更原因	侧支架单独供货，取消2个连接螺栓				
风险点 (影响)	无				
验证方法	无				


PDECR 25-032

	零件号	零件名称	Project	样件阶段	变更来源
	F01Z5017P2-06	OUTLET PIPE	JIE-4JJ	C	BOSCH/Customer
	变更前				
变更描述			变更后		
	PIPE-ASSEMBLY: F01Z5017P2-01 PIN: F01Z51025K-01 PIN:F01Z51025L-01 PIN:F01Z51025M-01		PIPE-ASSEMBLY: F01Z5017P2-06 PIN: F01Z51025K-06 PIN:F01Z51025L-06		
			最终状态取消一个小吊钩 只有2组吊钩		
变更原因	进气端锥旋转，方便客户拆T6。进气管位置微调，吊钩需要新设计				
风险点 (影响)	机械强度不足				
验证方法	FEA仿真后，评估无影响，报告见附件				

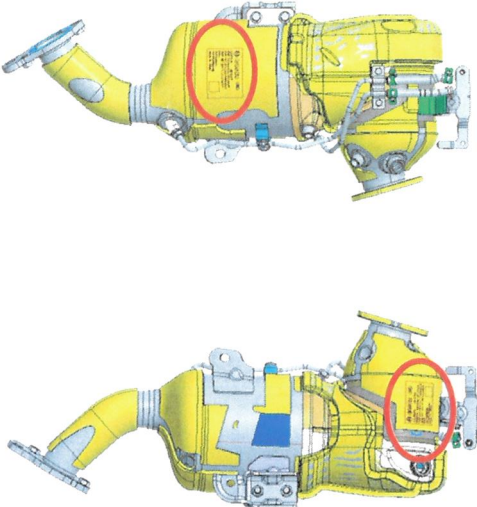

PDECR 25-032

	零件号	零件名称	Project	样件阶段	变更来源
	F01Z5018AX	INSULATION	J1e-4JJ	C	BOSCH/Customer
	变更前				
变更描述	手工保温			变更后	
				 INSULATION WITH MAT: F01Z5018AX FOIL: F01Z5017NZ- MAT: F01Z5102RK MAT:F01Z5102RL	
变更原因	C样件新开保温-493已量产				
风险点 (影响)	无				
验证方法	无				

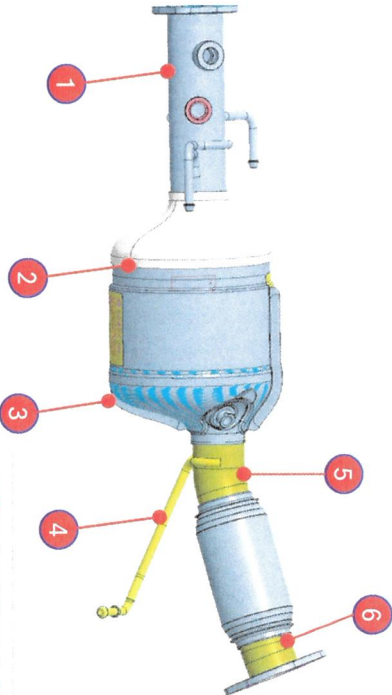
PDECR 25-032

	零件号	零件名称	Project	样件阶段	变更来源
	F01Z5018AY	INSULATION	J1e-4JJ	C	BOSCH/Customer
	变更前				
变更描述	手工保温		变更后		
			 INSULATION WITH MAT: F01Z5018AY FOIL: F01Z5017NU MAT: F01Z5102RM MAT:F01Z5102RN		
变更原因	C样件新开保温-493已量产				
风险点 (影响)	无				
验证方法	无				

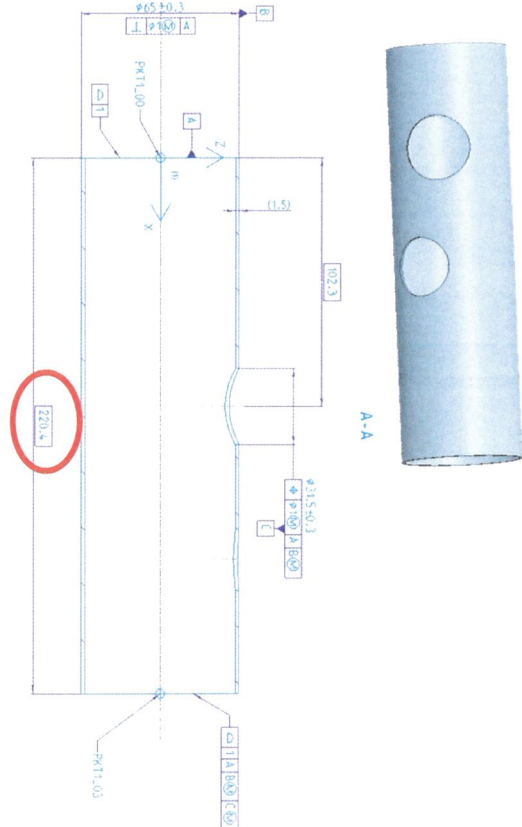
PDECR 25-032

	零件号	零件名称	Project	样件阶段	变更来源
	F01ZH003EA-03	铭牌	Jle-4JJ	C	BOSCH/Customer
	变更前				变更后
变更描述			 BOSCH  SDPF 封装：博世汽车系统（无锡）有限公司 SDPF 载体：NGK（苏州）环保陶瓷有限公司 SDPF 涂层：压信万丰（上海）化工有限公司 E415 747514121 F01ZH003EA-03 Made in China  BOSCH  SDPF 封装：博世汽车系统（无锡）有限公司 SDPF 载体：NGK（苏州）环保陶瓷有限公司 SDPF 涂层：压信万丰（上海）化工有限公司 E415 747514121 F01ZH003EA-03 Made in China 		
变更原因	弗吉亚工厂，铭牌为保温壳供应商打刻，位置需要更新，铭牌内容需要更新				
风险点（影响）	铭牌位置更改客户不同意				
验证方法	已沟通客户，客户认可。同493项目				

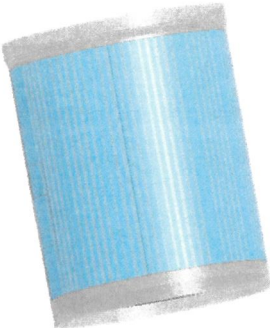
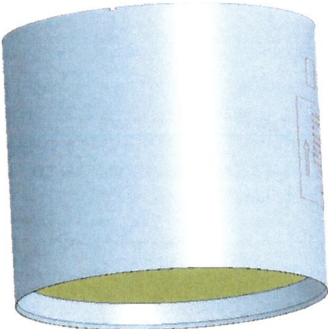
PDECR 25-032

	零件号	零件名称	Project	样件阶段	变更来源
	F01ZH003EB-05	SCR UNIT	JIE-4JJ	C	BOSCH/Customer
	变更前后				
变更描述	  SCR 主要变更点如下: 1.尾管长度增长 2.封装筒体缩短 3.保温壳需要折弯 4.吊钩更改 5.6. 进气管微调 - 焊丝改为439Ti, 同量产493				
变更原因	封装筒体不需要预留一寸，canning 同493。进气端锥旋转，方便客户拆T6。保温壳飞边在整车上最低点需要压平				
风险点 (影响)	零件变更，机械强度无法满足要求				
验证方法	FEA仿真后，结果均小于更改前数据，评估无影响				

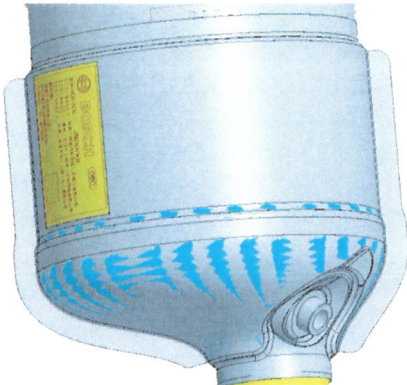
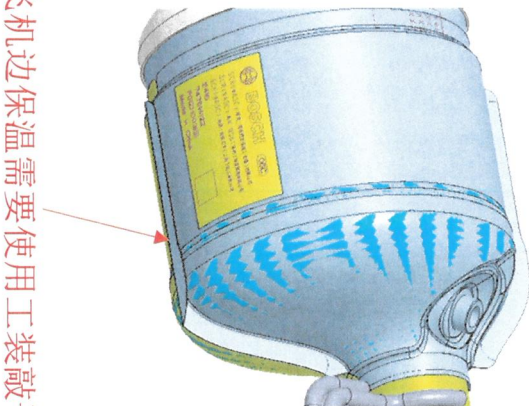
PDECR 25-032

零件号		零件名称		Project		样件阶段		变更来源	
F01Z510262-05		OUTLET PIPE		JIE-4JJ		C		BOSCH/Customer	
		变更前				变更后			
变更描述									
变更原因		封装筒体不需要预留一寸，canning 同493，尾管需要增长连接							
风险点（影响）		无							
验证方法		无							

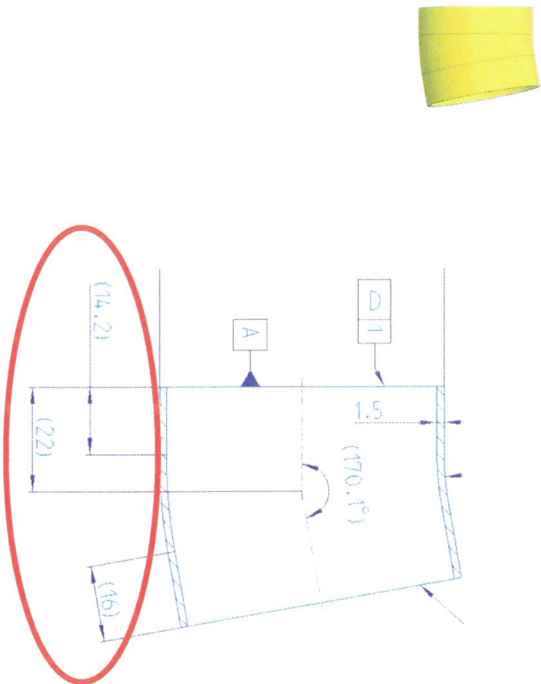
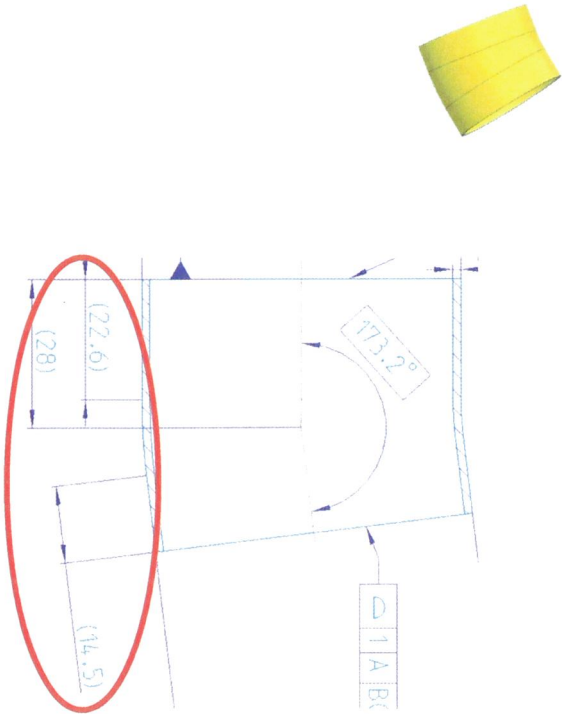
PDECR 25-032

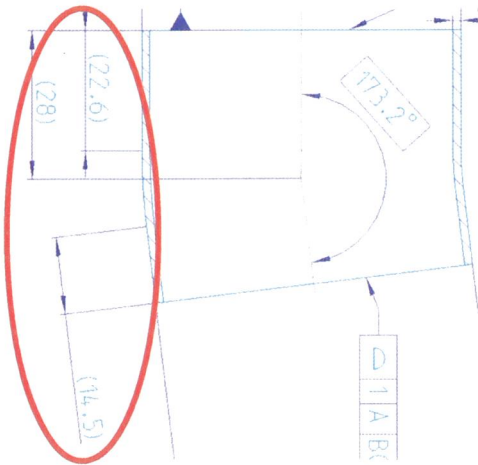
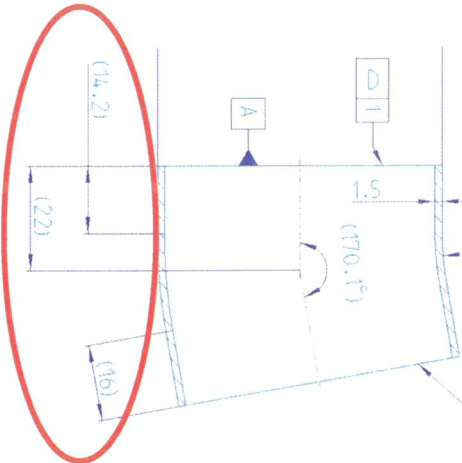
	零件号	零件名称	Project	样件阶段	变更来源
	F01Z5017WA	SCR CANNING	J1E-4JJ	C	BOSCH/Customer
	变更前				
变更描述					
	F01Z5017P1-02		SCR CANNING: F01Z5017WA		
变更原因	封装筒体不需要预留一寸，canning 同493				
风险点 (影响)	无/493已经验证OK				
验证方法	无				

PDECR 25-032

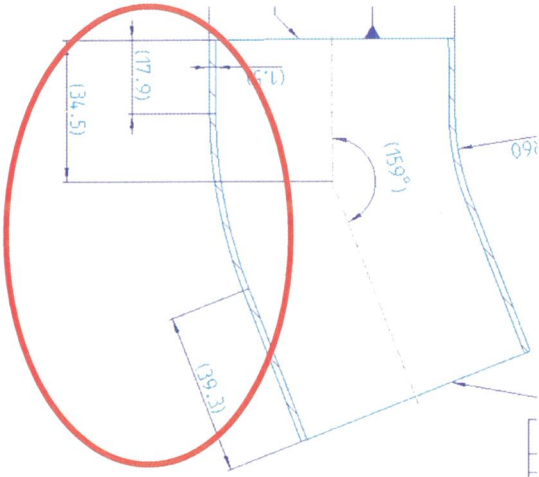
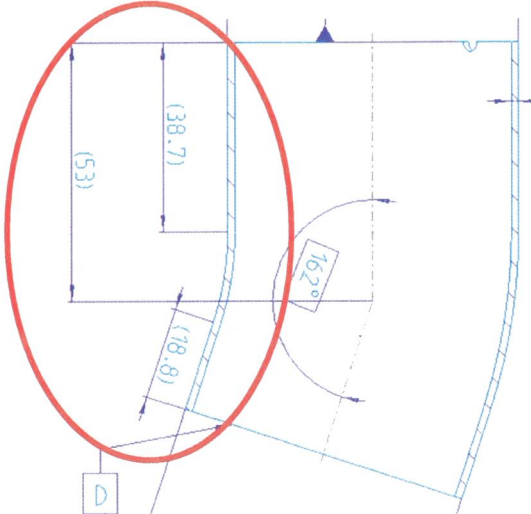
	零件号	零件名称	Project	样件阶段	变更来源
	F01Z5018D8-00	INSULATION	JIE-4JJ	C	BOSCH/Customer
	F01Z5018D9-00				
	变更前			变更后	
变更描述					
变更原因	T6位置旋转后，保温飞机边在整车最低点，客户要求把飞机边敲平				
风险点 (影响)	无				
验证方法	无				

PDECR 25-032

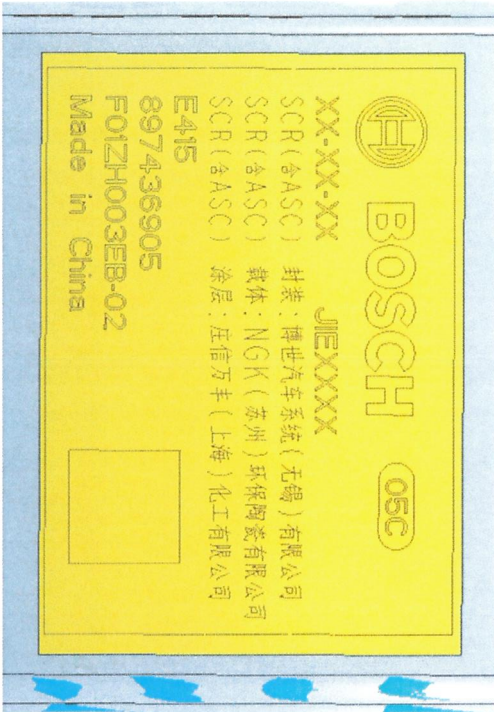
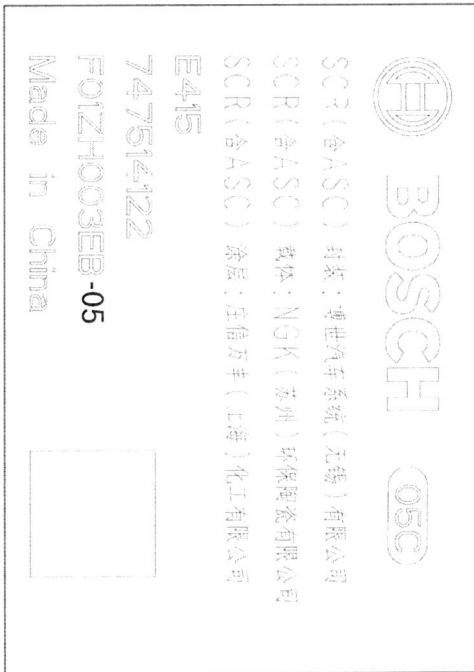
零件号		零件名称		Project		样件阶段		变更来源	
F01Z510261-05		OUTLET PIPE		JIE-4JJ		C		BOSCH/Customer	
		变更前				变更后			
变更描述									
变更原因		进气端锥旋转，方便客户拆T6。进气管位置尺寸微调,同时增加工艺定位孔							
风险点 (影响)		机械强度不足							
验证方法		FEA仿真后，结果均小于更改前数据，评估无影响							



PDECR 25-032

零件号		零件名称		Project		样件阶段		变更来源							
F01Z510260-05		OUTLET PIPE		JIE-4JJ		C		BOSCH/Customer							
变更前				变更后											
变更描述				 						 					
变更原因				进气端锥旋转，方便客户拆T6。进气管位置微调，同时增加工艺定位孔											
风险点 (影响)				机械强度不足											
验证方法				FEA仿真后，结果均小于更改前数据，评估无影响											

PDECR 25-032

		零件号	零件名称	Project	样件阶段	变更来源
		F01ZH003EB-05	铭牌	JIE-4JJ	C	BOSCH/Customer
		变更前		变更后		
变更描述						
变更原因	弗吉亚工厂，铭牌为保温壳供应商打刻，位置需要更新，铭牌内容需要更新					
风险点（影响）	铭牌位置更改客户不同意					
验证方法	已沟通客户，客户认可。同493项目					

ATS C Sample initial release precondition

C Sample Drawing initial Release Checklist

C Sample Drawing Release Pre-condition Checklist		Result/Report	Status	Resp.	Date
Design	1. C Sample 3D model confirmed by customer?	OK	OK		
	2. C Sample offer drawing check with manufacturing drawing?				
	3. C Sample Nameplate confirmed by customer? Email or drawing confirm?				
	4. D-FMEA first version finished?			800070	2015.8.26
	5. I-FMEA first version finished?				
	6. Installation guideline finished?				
	7. PSC/CC list finished for CMK summary?				
PUR/MOE	1. C Sample Make and Buy confirmed?	OK		李安	2015.8.26
	2. C sample DFMA welding process confirmed with MOE? Flow chart?				
	3. P-FMEA first version plan?				
DV	1. Canning validation finished ? report?	OK	Done	Xu Run	2015.05.06
	2. ATS DV validation finished? report?	OK	Done	Xu Run	2016.05.06
System	1. TCD status?	OK	preliminary TCD done	李安	2015.05.06
	2. POC result & report ?	OK	sample test		
