

Confidential

Design Change
Request No. 25_032

Customer project Name/ 客户项目名称: JIM-4JJ MCR No. / MCR号:

Sample status / 样件状态: ☐ A Sample ☐ B Sample ☒ C Sample ☐ D Sample

Change part&product Name/更改零部件产品的名称(简要描述)

DOC+SDPF新鲜件(不可拆): F01ZH003EA-03

675

SCR新鲜件: F01ZH003EB-05

Reason of changes/更改理由(简要描述):

依据客户需求, 提供 JIE-4JJ C样OTS件;

Change from/变更来源:

Customer request / 客户要求 ☒ Supplier request / 供应商请求 ☐ Design optimization / 设计优化 ☐
Correction / 更正(错误) ☐ Other / 其他 ☐ ()

Change inform to/变更通知人: Zhang Shengchang, Zhang Hanquan, Shen Weibo, Li Yicen, Fang Jiayan, Yin Kangzhuang
Yang Guangtuo, Jia Kebin, Luo jing, Lu Qingsong, Xie Youfu

Whether this change impact others component or product 此变更是否影响到其他部件和产品: ☐ yes/是 ☒ no/否

If impact others product, Whether others projects&product change or not? 如果影响, 别的部件和产品是否也需要同时变更?

Design / 设计工程师

Signature / 签名:

马坤阳

Date / 日期:

2025.08.05

Check / 校对工程师

Signature / 签名:

杨广拓

Date / 日期:

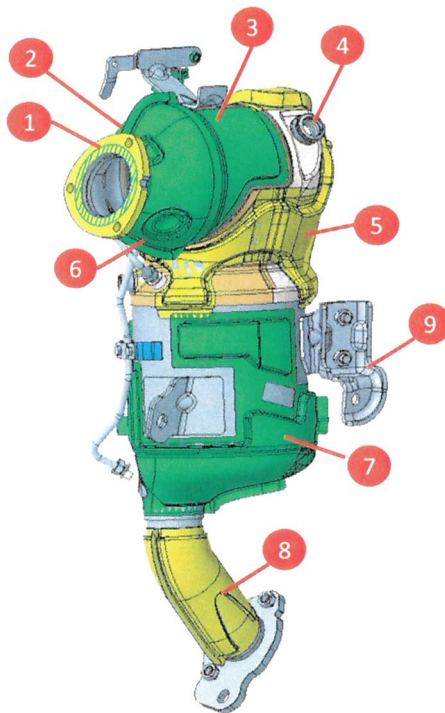
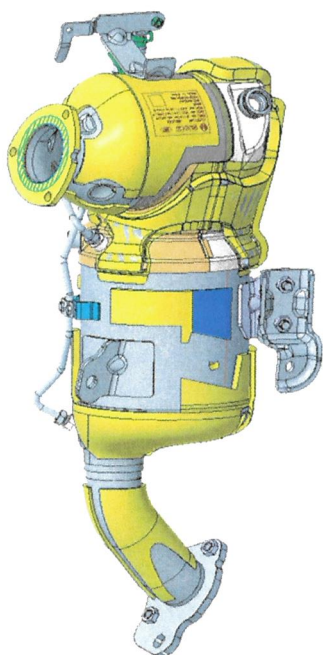
2025.08.27

Description of Change/更改描述: (下面空白处请列出详细的变更前后对比)

B样件

C样件

具体变更详见附件



DOC DPF 主要变更点如下:

1. 进气法兰加厚2mm
2. 进气端锥进气口直径增大4mm, 长度缩短4mm
3. DOC-canning 不共用493, 筒体缩短
4. 喷嘴座缺口位置调整
5. 混合器保温共用493
6. 新开DOC模具件保温
7. 新开DPF模具件保温
8. 新开尾管模具件保温 (暂定不开)
9. 侧支架依据模具供应商要求调整

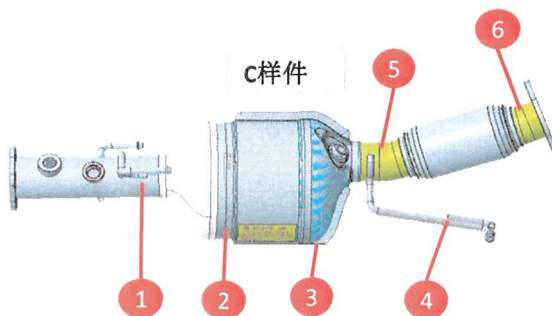
SCR 主要变更点如下:

1. 尾管长度增长
2. 封装筒体缩短
3. 保温壳需要折弯
4. 吊钩更改
5. 进气管微调

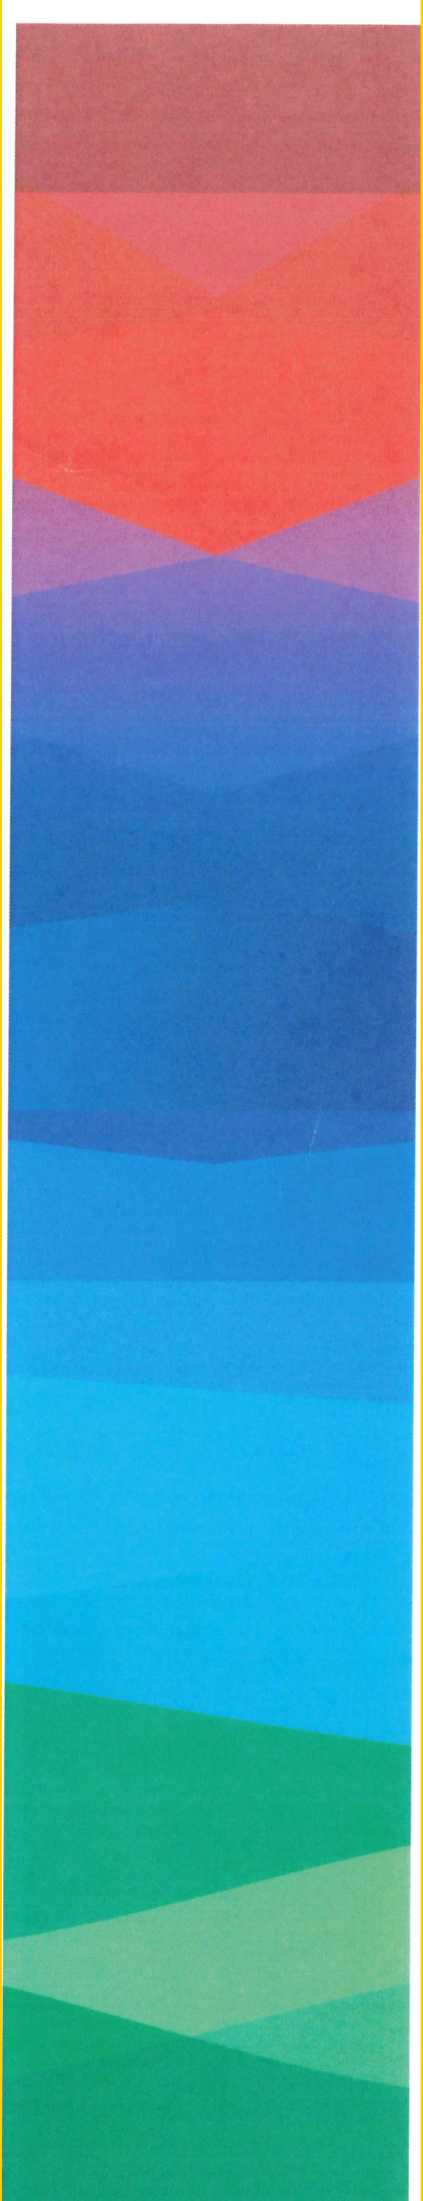
B样件



C样件




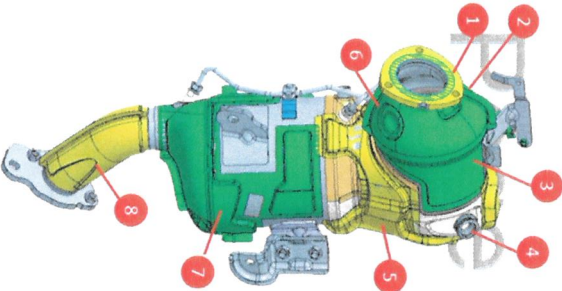
 Confidential	Design Change Review Sheet 设计变更评审表		Version 13 Effective date: 2025-05-10th
			Design Change Request No.
1. Function&Performance will be influenced? / 系统性能影响? ☐ yes/是 ☒ no/否			
If Yes, System impact evaluation? 如果是, 系统影响评估? (如果是初次样件放行, 空白处请说明样件目的)		AIS POC 已完成	
Whether need sample to test? Plan? 是否需要样件进行验证? 计划?		NA	
Whether the catalyst information is confirmed? 催化剂信息是否确认? (物料号、图纸、SPEC)		同 493 催化剂	
		System/签名 沈伟波	
		Catalyst/签名 张江泉	
2. Interface&boundary (internal and customer) will be influenced? / 接口&边界(内部和客户)影响? ☐ yes/是 ☒ no/否			
If impact customer ,whether get confirm from customer side? 请说明影响和是否得到客户的确认?		客户已确认	
		Design /签名 马坤阳	
3. Mechanical strength&Durability will be influenced? / 机械强度&可靠性影响? ☐ yes/是 ☒ no/否			
If Yes, How to evaluate? Plan? 如果是, 请说明影响和如何评估,计划? (例如:仿真分析等)			
Whether need sample to test? Plan? 是否需要样件进行验证? 计划?		DV finished. results passed	
		Validation/签名 XuRun	
4. Product document influenced?			
4.1 Interface FMEA-relevant / IFMEA:		☐ no/否 ☐ yes/是 Note	
4.2. Product FMEA-relevant / DFMEA:		☐ no/否 ☐ yes/是 Note	
4.3. Special Charecteristics /PSC: (针对C Sample)		☐ no/否 ☐ yes/是 Note	
4.4. IMDS relevant: (针对C Sample)		☐ no/否 ☐ yes/是 Note	
4.5 Offer drawing relevant:(针对C Sample)		☐ no/否 ☐ yes/是 Note	
4.6. TCD relevant:		☐ no/否 ☐ yes/是 Note	
		Design /签名	
5. Changed parts Stock& treatment / 需要变更零件的库存统计和处理? ☐ NA.(新零件放行,不涉及库存) (只针对涉及到已经生产过的零件变更, 新放行零件和本条不相关) ☐ 涉及到已经生产过的零件变更			
RBCW RDC(外库)和RBCW 仓库, 是否有库存,		☐ 无库存 ☐ 有库存, 库存数量	
供应商处(已做好, 未发货)是否有库存,		☐ 无库存 ☐ 有库存, 库存数量	
LPN工厂是否有库存,		☐ 无库存 ☐ 有库存, 库存数量	
在途, 运输中是否有库存		☐ 无库存 ☐ 有库存, 库存数量	
		PUE /签名 李亮	
被影响到的实物库存处理指示: (设计工程师组织会议讨论)		☐ 可以继续使用完 ☐ 改制后使用 ☐ 报废	
		☐ 改制费用; ☐ 报废成本;	
		Design /签名	
已装车件处理方法 (发客户或标定车等) (SMP组织会议讨论)		☐ 改制; ☐ 更换; 其他 (单独说明);	
		PUE /签名 李亮	
6. Influence on supplier part?			
Was this change confirmed with Purchasing (Supplier) for feasibility? Feedback from Supplier? 变更后的零件, 生产可行性供应商是否确认? 反馈?			
Influence on purchasing part delivery time? 对采购件交货时间的影响?			
涉及到变更的零件, 博世已出PR, 供应商还未来得及生产的订单, 是否已经通知供应商取消. ☐ no/否 ☐ yes/是			
Does the change influence on purchasing cost? 变更对采购成本的影响?			
☐ increase/增加,金额 ☐ decrease/降低,金额 ☐ no change/不变		PUE/签名 李亮	
7. DFMA & Sample prodction OPL?			
必要时附加DFMA 文件			
无 OPL		Design /签名 马坤阳	
8. Influence on LPN manufacturing&assembly process?			
Feedback from manufacturing engineer? 生产制造装配是否影响, 反馈?			
Influence on project&product delivery time? 对项目&产品交货时间的影响?		OIS 量产报价 850	
Influence on manufacturing cost / 对生产成本的影响?			
☐ increase/增加,金额 ☐ decrease/降低,金额 ☐ no change/不变		PUE/签名 李亮	
9. PM alignment? (Influence on project Timeline? Cost?); 是否同意对项目时间和成本的影响; 需求样品订单数量		PM/签名 李亮	
10. 如果涉及以下情况需TCR3 审核确认。 不涉及则 NA: ☐ ☐ 库存报废,金额; ☐ 采购成本增加,金额; ☐ 生产成本增加,金额		RBCW/TCR3	
Design Team Leader	ENG-CV1	PUR	TCR3
Signature / 签名: 杨新	Signature / 签名: 88	Signature / 签名: 2025.8.27	Signature / 签名: 2025-09-02 李友福



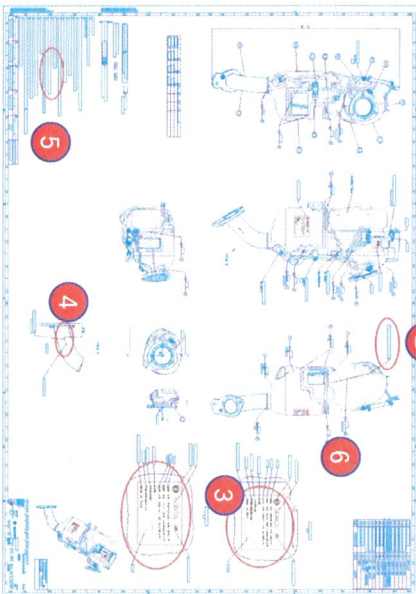
PDEC R25-032 (4JJ1-C 样件)

ENG-CV

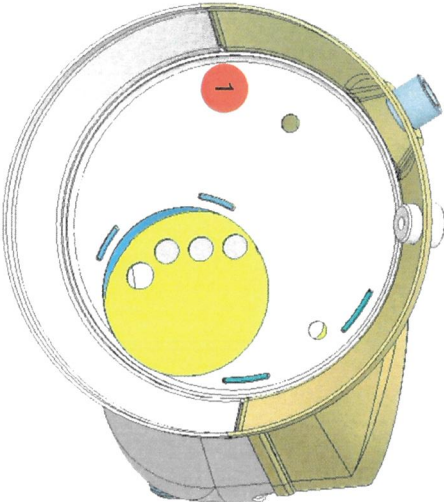
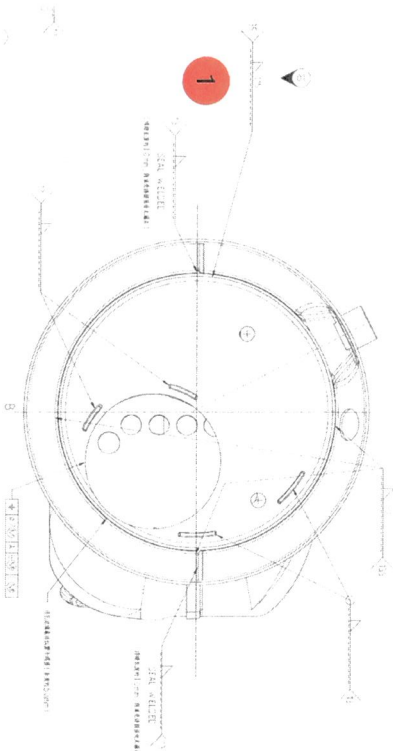
PDECR 25-032

变更描述	零件号	零件名称	Project	样件阶段	变更来源
	F01ZH003EA-03	DOC+SDPF UNIT	JIE-4JJ	C	BOSCH/Customer
	变更后				
变更原因	变更前				
					
					
	DOC DPF 主要变更点如下: 1.进气法兰加厚2mm 2.进气端锥进气口直径增大4mm, 长度减短4mm 3.DOC-canning 不共用493, 筒体不同 4.喷嘴座缺口位置调整 5.混合器保温共用493 6.新开DOC模具件保温 7.新开DPF模具件保温 8.新开尾管模具件保温				
变更原因	零件更改后处理总成随之更改, 混合器保温可以共用493, 其余6片保温需要新开模具, 样件使用手工包;				
风险点 (影响)	无				
验证方法	无				

PDEC R 25-032

零件号		零件名称		Project		样件阶段		变更来源	
F01ZH003EA-03		DOC+SDPF UNIT		JIE-4JU		C		BOSCH/Customer	
变更前				变更后					
变更描述				变更原因					
手工保温									
变更原因				零件更改后后处理总成随之更改，混合器保温可以共用493，其余6片保温需要新开模具，样件使用手工包；					
风险点（影响）				无					
验证方法				无					

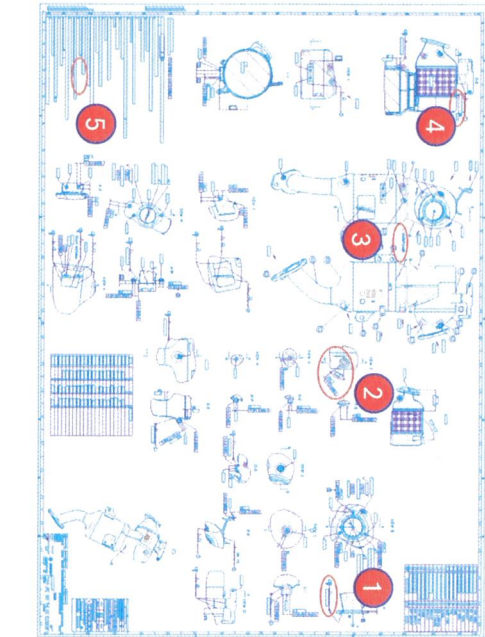
PDECR 25-032

	零件号	零件名称	Project	样件阶段	变更来源
	F01Z5017NN-03	MIXER UNIT	JIE-4JJ	C	BOSCH/Customer
	变更前			变更后	
变更描述				 1.处焊缝由50mm增长为115mm 08-20	
变更原因	增加焊缝长度，避免结晶掉落				
风险点（影响）	无				
验证方法	无				

PDEC R 25-032

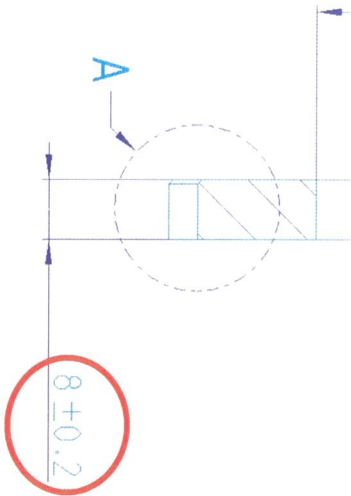
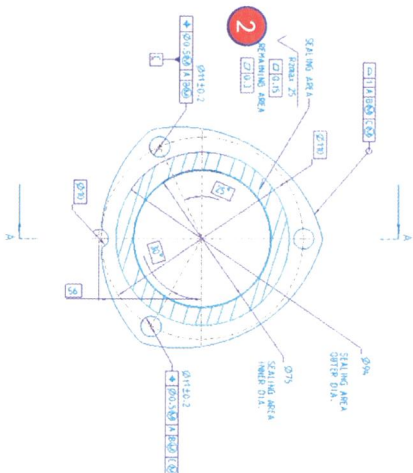
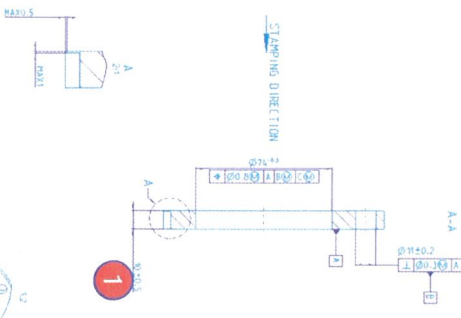
零件号		零件名称		Project		样件阶段		变更来源	
F01Z5017NL-03		DOC+SDPF WELDING		JIE-4JJ		C		BOSCH/Customer	
变更前				变更后					
F01Z5017NL-02									
变更描述				零件变更后, 焊接组件随之更改; 图纸更改见下页					
变更原因				零件变更后, 焊接组件随之更改;					
风险点 (影响)				无					
验证方法				无					

PDECR 25-032

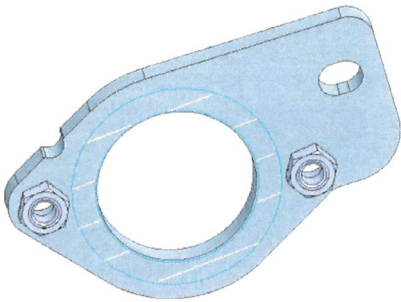
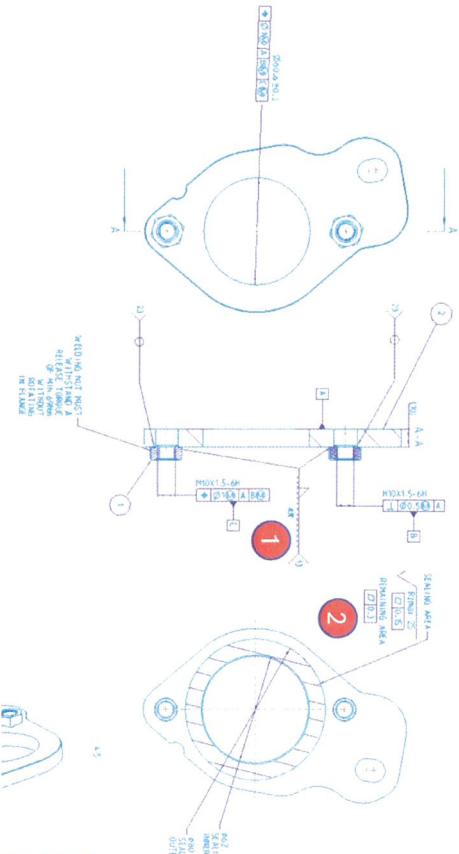
	零件号	零件名称	Project	样件阶段	变更来源
	F01Z5017NL-03	DOC+SDPF WELDING	JIE-4JJ	C	BOSCH/Customer
	变更前		变更后		
变更描述	F01Z5017NL-02		 1.端锥改为内焊 2.定义尿素喷嘴缺口位置度 3.混合器焊缝不允许泄露 4.封装插入深度改为MAX.8 5.焊丝改为439Ti，同量产493		
变更原因	零件变更后，焊接组件随之更改；				
风险点 (影响)	无				
验证方法	无				

Internal | Powertrain Solutions | RBCW/ENG-A1S2 | 2023-09-22

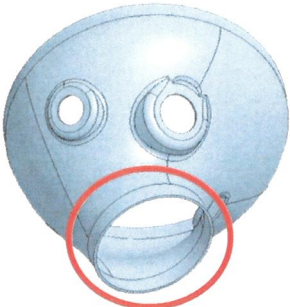
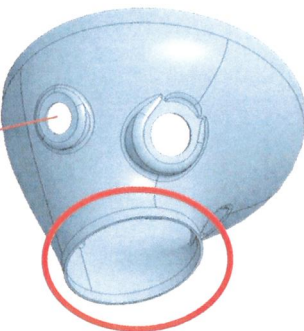
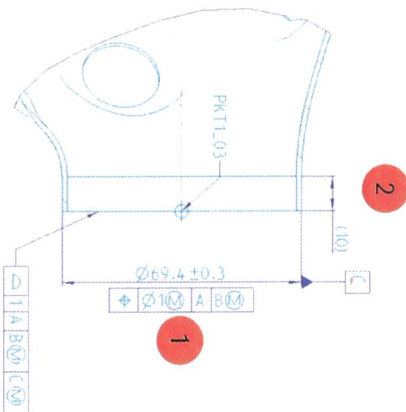
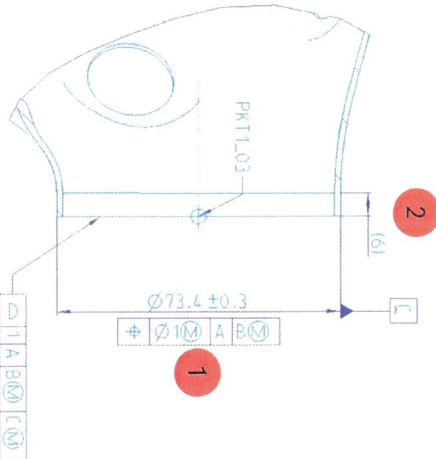
PDECR 25-032

零件号	零件名称	Project	样件阶段	变更来源
F01Z510258-03	FLANGE	JIE-4JJ1	C	BOSCH/Customer
变更描述				
变更前		变更后		
 		  1.法兰厚度更改 2.平面度更改-同493		
变更原因	弗吉亚工厂评估，传感器座不好焊接，需要调整焊接顺序，端锥和法兰需要内焊，需要增厚法兰厚度，方便焊接			
风险点 (影响)	法兰增重，焊缝强度不足			
验证方法	FEA仿真更改后结果数据，优于更改前数据 (报告见附件)			

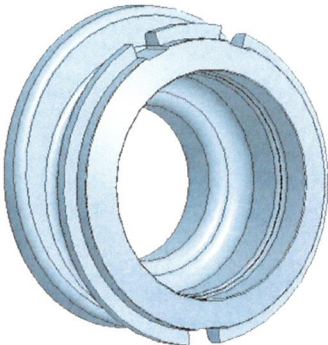
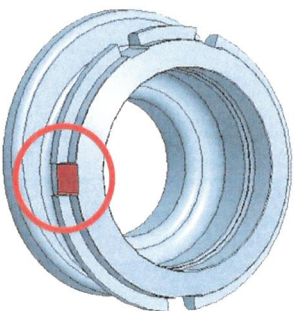
PDEC R 25-032

零件号		零件名称		Project		样件阶段		变更来源	
F01Z5017P4-03		FLANGE		J1E-4JJ1		C		BOSCH/Customer	
变更前				变更后					
									
变更描述									
变更原因				弗吉亚工厂评估, 螺母不好焊接, 需要增加点焊才可以满足脱落要求。平面度更改-同493					
风险点 (影响)				无					
验证方法				无					

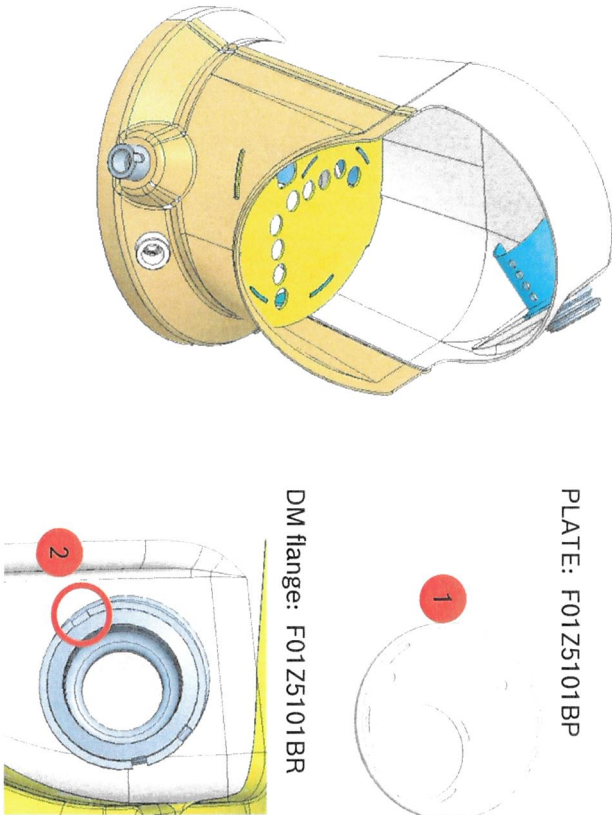
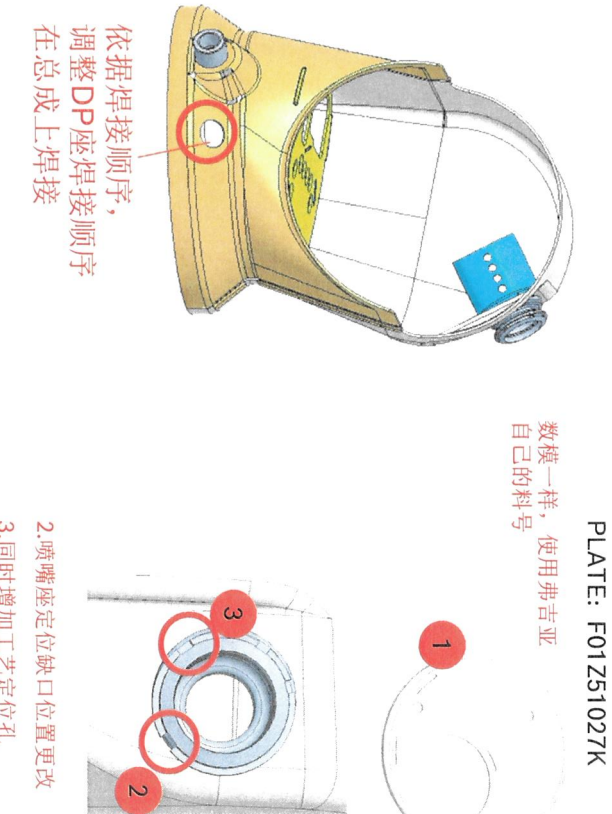
PDEC R 25-032

零件号	零件名称	Project	样件阶段	变更来源
F01Z510259-03	CONE	JIE-4UJ1	B	BOSCH/Customer
变更前		变更后		
变更描述				
				
				
变更原因				
1.弗吉亚工厂评估，传感器座不好焊接，需要调整焊接顺序，端锥和法兰需要内焊，需要进气口直线段减短。2.客户要求进气口直径增大				
风险点（影响）				
1.FEA仿真更改后结果数据，优于更改前数据（报告见附件）评估风险较小。2.进气口直径增大王笛评估无影响				
验证方法				



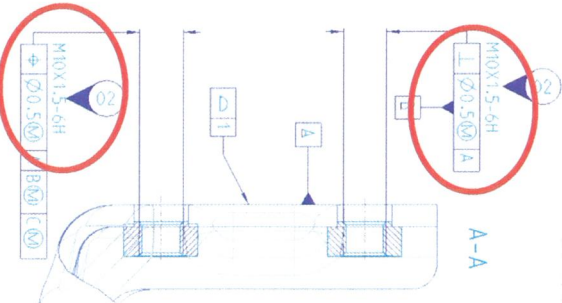
PDECR 25-032

	零件号	零件名称	Project	样件阶段	变更来源
	F01Z5102TD-00	DM flange	Jle-4JJ	C	BOSCH/Customer
	变更前				
变更描述			 增加工艺定位孔 防止和493混料		
变更原因	C样件新开保温				
风险点 (影响)	无				
验证方法	无				

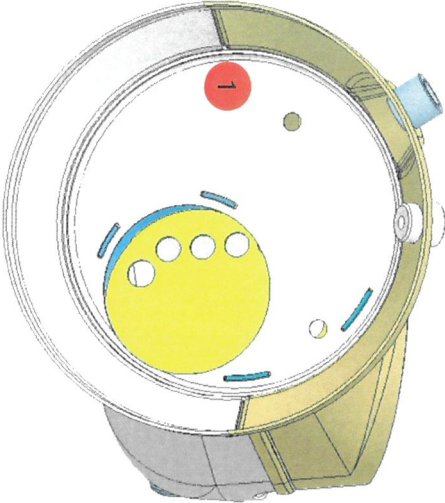
PDECR 25-032

零件号		零件名称		Project	样件阶段	变更来源
F01Z5017NN-03		MIXER UNIT		JIE-4JJ	C	BOSCH/Customer
变更前				变更后		
 PLATE: F01Z5101BP DM flange: F01Z5101BR				 PLATE: F01Z51027K 数模一样, 使用弗吉亚自己的料号 1.共用弗吉亚零件。2.依据客户要求调整喷嘴角度 依据焊接顺序, 调整DP座焊接顺序 在总成上焊接 2.喷嘴座定位缺口位置更改 3.同时增加工艺定位孔		
变更描述						
变更原因				1.共用弗吉亚零件。2.依据客户要求调整喷嘴角度		
风险点 (影响)				无		
验证方法				无		

PDECR 25-032

	零件号	零件名称	Project	样件阶段	变更来源
	F01Z5017P5-05	BRACKET	Jle-4JJ	C	BOSCH/Customer
	变更前				
变更描述	F01Z5017P5-01		变更后		
					
			 和供应商确认最终可行性OK 更新图纸，螺母增加点焊， 孔径及位置度更新 增加刻字区域 同时后续单独供货 1.F01Z51025V支架孔直径13±0.2收^严至12.5±0.2; 2.F01Z5017P5螺母孔垂直度1收^严至0.5; 位置度1收^严至0.5 5JE2501480 客户料号更新 08-20		
变更原因	供应商反馈B样件成型困难，需要优化数模				
风险点 (影响)	机械强度不足				
验证方法	FEA仿真结果可以满足要求，见附件				


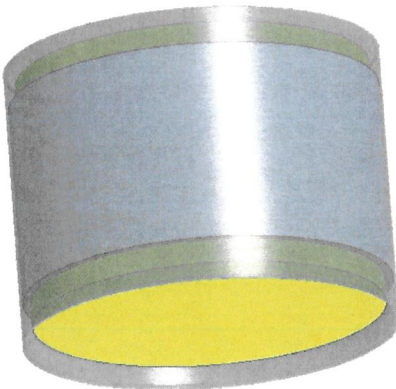
PDECR 25-032

	零件号	零件名称	Project	样件阶段	变更来源
	F01Z5017NN-03	MIXER UNIT	JIE-4UJ	C	BOSCH/Customer
	变更后				
变更描述	变更前				
变更原因					
风险点 (影响)	增加焊缝长度，避免结晶掉落				
验证方法	无				

Internal | Powertrain Solutions | RBCW/ENG-ATSD | 2023-09-22

Information contained herein is the property of Bosch Powertrain. It is not to be disclosed, copied, or used in any way without the written permission of Bosch Powertrain. Bosch Powertrain is not responsible for any damages or losses resulting from the use of this information. Bosch Powertrain is not responsible for any damages or losses resulting from the use of this information.

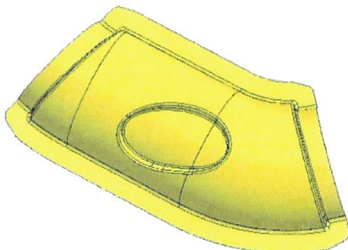
PDECR 25-032

	零件号	零件名称	Project	样件阶段	变更来源
	F01Z5018E4-00	DOC CANNING	J1E-4JJ1	C	BOSCH/Customer
	变更前				
变更描述			变更后		
					
基于B样件 筒体长度无更改					
不借用493 C样件 493-C样件筒体已经加长, 4jj无需加长筒体					
变更原因	前期共用493, 为同一个料号, 493后期增加筒体长度, 4jj筒体无需增加, 需要新取一个料号				
风险点 (影响)	无/493项目已经验证OK				
验证方法	无				

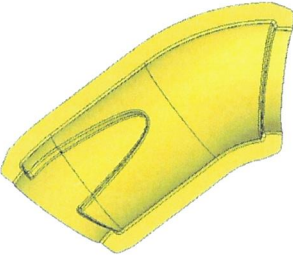
Internal | Powertrain Solutions | RBCW/ENG-AT52 | 2023-09-22

DISCLAIMER: This document contains confidential information of Bosch. It is not to be distributed outside the company without prior written permission of Bosch. The information is provided "as is" without any warranty, express or implied. Bosch disclaims any liability for damages or losses of any kind arising from the use of this document. The information is subject to change without notice. Please refer to the latest version of this document for any updates.

PDECR 25-032

	零件号	零件名称	Project	样件阶段	变更来源
	F01Z5018DR-00	INSULATION	J1e-4JJ	C	BOSCH/Customer
	变更前				
变更描述	手工保温		变更后		
					
			INSULATION WITH MAT: F01Z5018DR-00 FOIL: F01Z5017RM-01 MAT: F01Z5102VJ-00		
			暂定不开模具		
变更原因	C样件新开保温/				
风险点 (影响)	无				
验证方法	无				

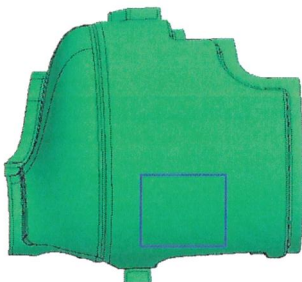
PDECR 25-032

	零件号	零件名称	Project	样件阶段	变更来源
	F01Z5018DS-00	INSULATION	Jle-4JJ	C	BOSCH/Customer
	变更前				
变更描述	手工保温		变更后		
			 INSULATION WITH MAT: F01Z5018DS-00 FOIL: F01Z5017RN-01 MAT: F01Z5102YK-00 暂定不开模具		
变更原因	C样件新开保温				
风险点 (影响)	无				
验证方法	无				

PDECR 25-032

	零件号	零件名称	Project	样件阶段	变更来源
	F01Z5018DT-00	INSULATION	J1e-4JJ	C	BOSCH/Customer
	变更前				
变更描述	手工保温		变更后		
			INSULATION WITH MAT: F01Z5018DT-00 FOIL: F01Z5017RP-01 MAT: F01Z5102VL-00 MAT: F01Z5102VU-00 MAT: F01Z5102VW-00 MAT: F01Z5102VV-00 MAT: F01Z5102VS-00 和供应商确认最终可行性OK 更新棉，保温壳图纸		
变更原因	C样件新开保温				
风险点 (影响)	无				
验证方法	无				

PDECR 25-032

	零件号	零件名称	Project	样件阶段	变更来源
	F01Z5018DU-00	INSULATION	J1e-4JJ	C	BOSCH/Customer
	变更前				
变更描述	手工保温		变更后		
			 INSULATION WITH MAT: F01Z5018DU-00 FOIL: F01Z5017RR-01 MAT: F01Z5102VM-00 MAT:F01Z5102VT-00 和供应商确认最终可行性OK 更新棉，保温壳图纸， 增加刻字压平区域		
变更原因	C样件新开保温				
风险点 (影响)	无				
验证方法	无				

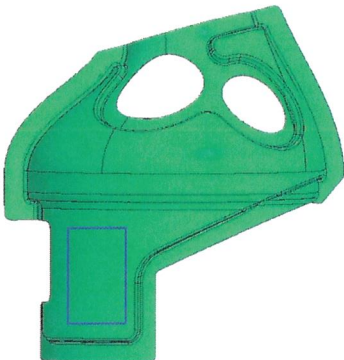
PDECR 25-032

	零件号	零件名称	Project	样件阶段	变更来源
	F01Z5018DV-00	INSULATION	Jle-4JJ	C	BOSCH/Customer
	变更前				
变更描述	手工保温		变更后		
			 INSULATION WITH MAT: F01Z5018DV-00 FOIL: F01Z5017RS-01 MAT: F01Z5102VN-00 和供应商确认最终可行性OK 更新棉，保温壳图纸		
变更原因	C样件新开保温				
风险点 (影响)	无				
验证方法	无				

Internal | Powertrain Solutions | RBCW/ENG-AT52 | 2023-09-22

...the information provided here is for informational purposes only and does not constitute an offer or a commitment. Bosch is not responsible for any errors or omissions in this document.


PDECR 25-032

	零件号	零件名称	Project	样件阶段	变更来源
	F01Z5018DW-00	INSULATION	Jle-4JJ	C	BOSCH/Customer
	变更前				
变更描述	手工保温		变更后		
					
			INSULATION WITH MAT: F01Z5018DW-00 FOIL: F01Z5017RT-01 MAT: F01Z5102VP-00 和供应商确认最终可行性OK 更新棉，保温壳图纸， 增加刻字压平区域		
变更原因	C样件新开保温				
风险点 (影响)	无				
验证方法	无				


PDECR 25-032

	零件号	零件名称	Project	样件阶段	变更来源
	F01Z51025D-00	PIPE	Jle-4JJ	C	BOSCH/Customer
	变更前		变更后		
变更描述					
变更原因	依据工厂工艺要求，增加工艺定位孔				
风险点 (影响)	无				
验证方法	无				


PDECR 25-032

	零件号		零件名称		Project	样件阶段	变更来源
	F01Z51025U-02		BOLT		J1e-4JJ	C	BOSCH/Customer
	变更前					变更后	
变更描述						取消	
变更原因	侧支架单独供货，取消2个连接螺栓						
风险点 (影响)	无						
验证方法	无						


PDECR 25-032

	零件号		零件名称	Project	样件阶段	变更来源
	F01Z5017P2-06		OUTLET PIPE	JIE-4JJ	C	BOSCH/Customer
	变更前			变更后		
变更描述	 PIPE-ASSEMBLY: F01Z5017P2-01 PIN: F01Z51025K-01 PIN:F01Z51025L-01 PIN:F01Z51025M-01			 PIPE-ASSEMBLY: F01Z5017P2-06 PIN: F01Z51025K-06 PIN:F01Z51025L-06 最终状态取消一个小吊钩 只有2组吊钩		
变更原因	进气端锥旋转，方便客户拆T6。进气管位置微调，吊钩需要新设计					
风险点 (影响)	机械强度不足					
验证方法	FEA仿真后，评估无影响，报告见附件					

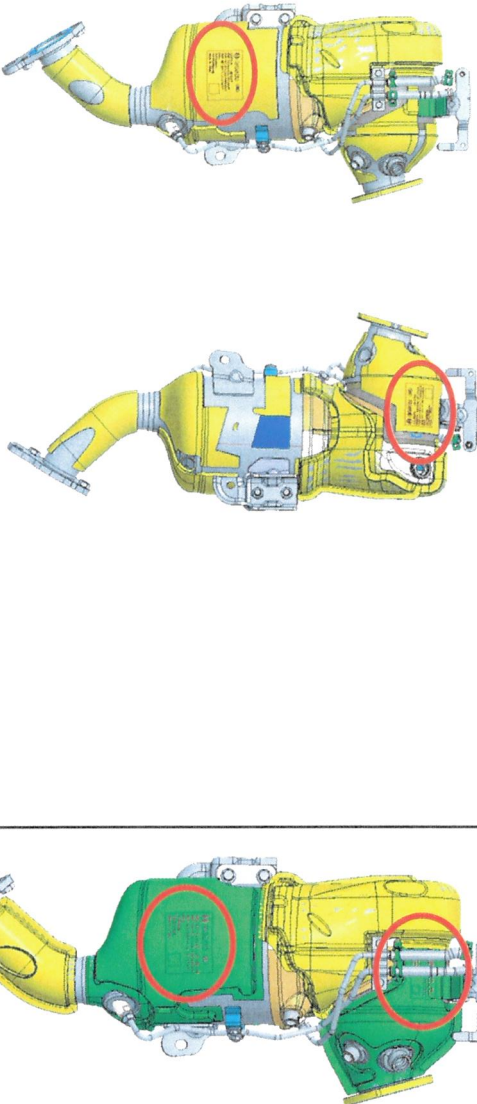
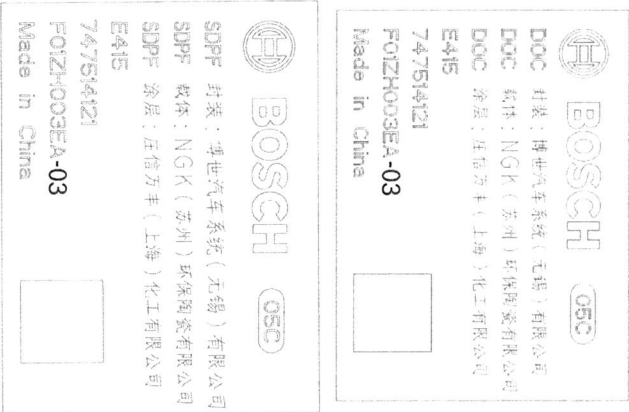
PDECR 25-032

	零件号	零件名称	Project	样件阶段	变更来源
	F01Z5018AX	INSULATION	Jle-4JJ	C	BOSCH/Customer
	变更前				
变更描述	手工保温		变更后		
			 INSULATION WITH MAT: F01Z5018AX FOIL: F01Z5017NZ- MAT: F01Z5102RK MAT:F01Z5102RL		
变更原因	C样件新开保温-493已量产				
风险点 (影响)	无				
验证方法	无				

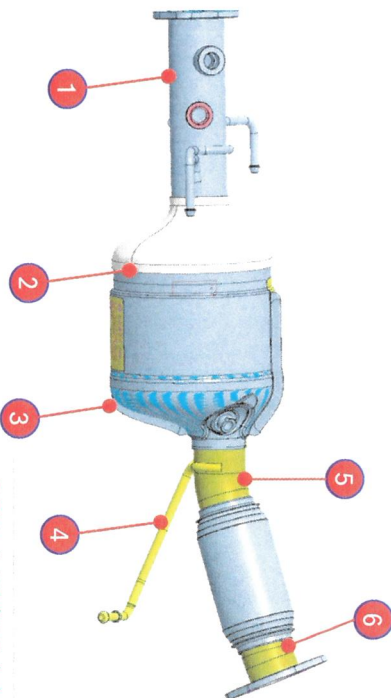
PDECR 25-032

	零件号	零件名称	Project	样件阶段	变更来源
	F01Z5018AY	INSULATION	J1e-4JJ	C	BOSCH/Customer
	变更前				
变更描述	手工保温		变更后		
			 INSULATION WITH MAT: F01Z5018AY FOIL: F01Z5017NU MAT: F01Z5102RM MAT:F01Z5102RN		
变更原因	C样件新开保温-493已量产				
风险点 (影响)	无				
验证方法	无				

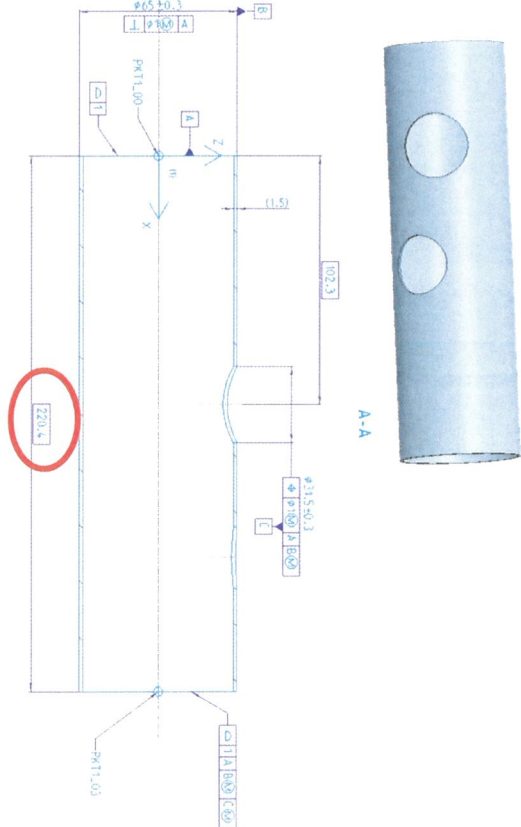
PDECR 25-032

变更原因	零件号		零件名称		Project	样件阶段		变更来源
	F01ZH003EA-03		铭牌			Jle-4JJ		
			变更前			变更后		
变更描述								
变更原因	弗吉亚工厂，铭牌为保温壳供应商打刻，位置需要更新，铭牌内容需要更新							
风险点 (影响)	铭牌位置更改客户不同意							
验证方法	已沟通客户，客户认可。同493项目							

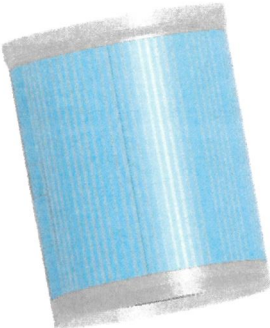
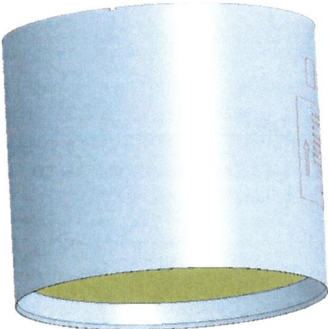
PDECR 25-032

零件号		零件名称		Project	样件阶段	变更来源
F01ZH003EB-05		SCR UNIT		JIE-4JJ	C	BOSCH/Customer
变更前				变更后		
变更描述 				 SCR 主要变更点如下: 1.尾管长度增长 2.封装筒体缩短 3.保温壳需要折弯 4.吊钩更改 5.6. 进气管微调 焊丝改为439Ti, 同量产493		
变更原因 封装筒体不需要预留一寸, canning 同493。进气管锥旋转, 方便客户拆T6。保温壳飞机边在整车上最低点需要压平						
风险点 (影响) 零件变更, 机械强度无法满足要求						
验证方法 FEA仿真后, 结果均小于更改前数据, 评估无影响						

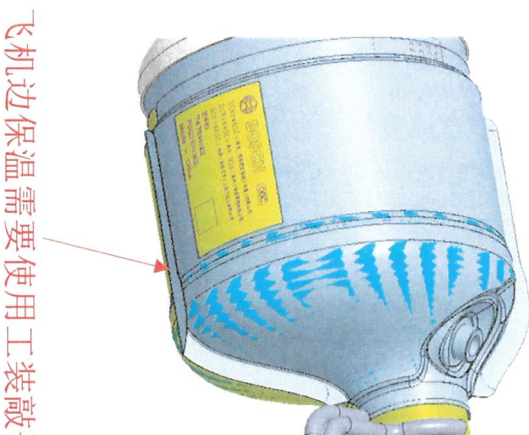
PDECR 25-032

	零件号	零件名称	Project	样件阶段	变更来源
	F01Z510262-05	OUTLET PIPE	JIE-4JJ	C	BOSCH/ Customer
	变更前后				
变更描述	 				
变更原因	封装筒体不需要预留一寸，canning 同493，尾管需要增长连接				
风险点 (影响)	无				
验证方法	无				

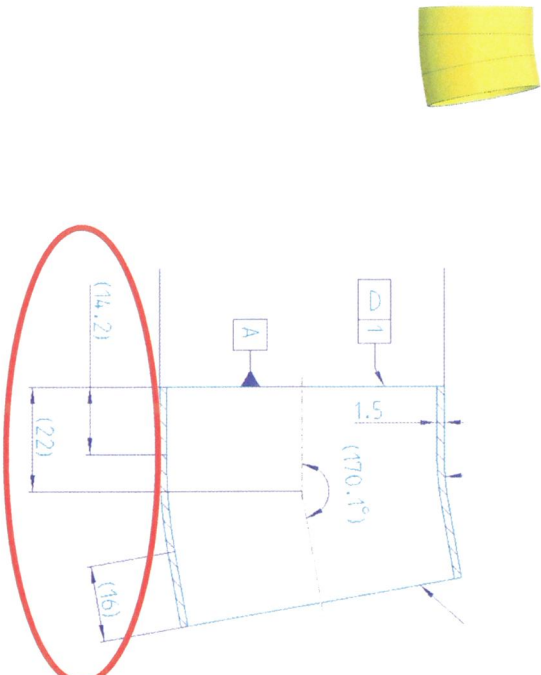
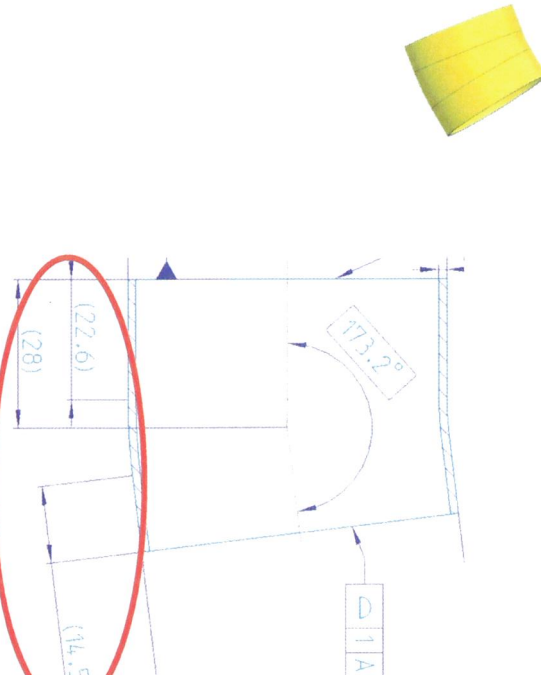
PDECR 25-032

	零件号	零件名称	Project	样件阶段	变更来源
	F01Z5017WA	SCR CANNING	J1E-4JJ	C	BOSCH/Customer
	变更前				
变更描述	 F01Z5017P1-02		 SCR CANNING: F01Z5017WA		
变更原因	封装筒体不需要预留一寸，canning 同493				
风险点 (影响)	无/493已经验证OK				
验证方法	无				

PDECR 25-032

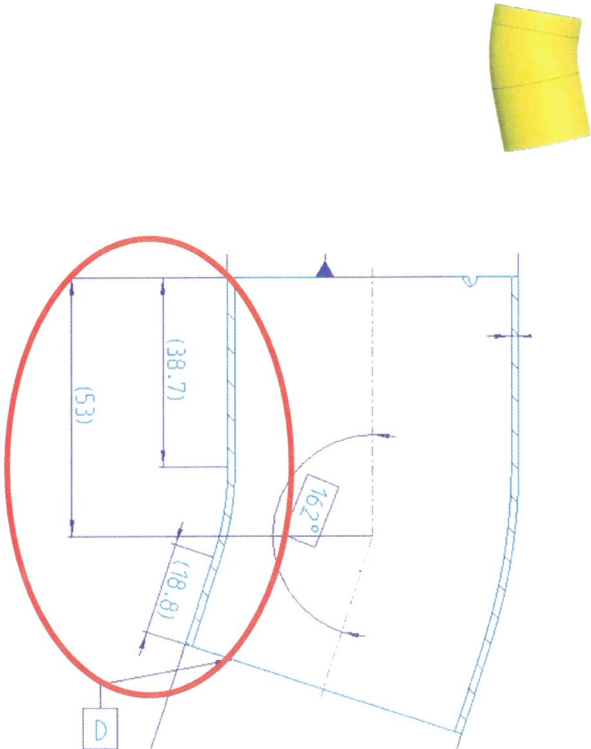
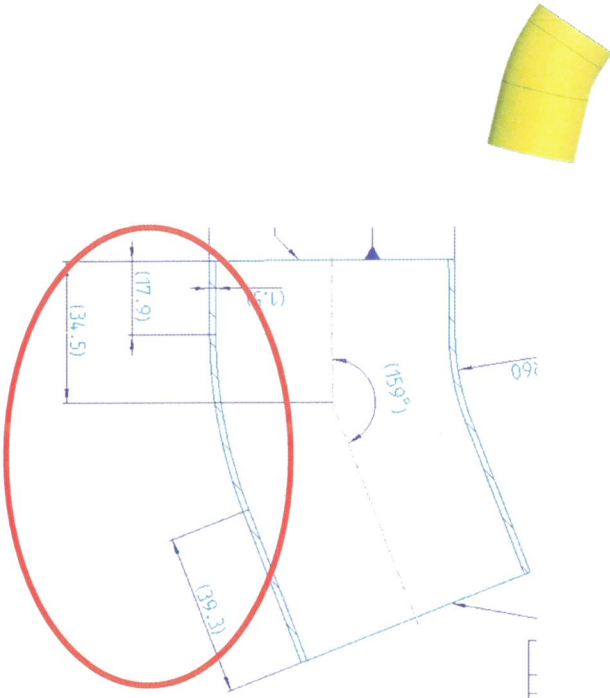
	零件号	零件名称	Project	样件阶段	变更来源
	F01Z5018D8-00 F01Z5018D9-00	INSULATION	J1E-4JJ	C	BOSCH/Customer
	变更前			变更后	
变更描述				 飞机边保温需要使用工装敲平	
变更原因	T6位置旋转后，保温飞机边在整车最低点，客户要求把飞机边敲平				
风险点（影响）	无				
验证方法	无				

PDECR 25-032

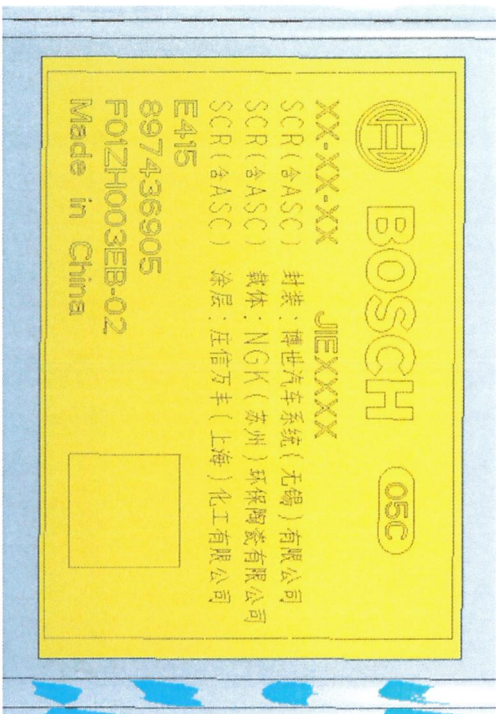
	零件号	零件名称	Project	样件阶段	变更来源
	F01Z510261-05	OUTLET PIPE	JIE-4JJ	C	BOSCH/Customer
	变更前		变更后		
变更描述					
变更原因	进气端锥旋转，方便客户拆T6。进气管位置尺寸微调,同时增加工艺定位孔				
风险点 (影响)	机械强度不足				
验证方法	FEA仿真后，结果均小于更改前数据，评估无影响				

PDECR 25-032

	零件号	零件名称	Project	样件阶段	变更来源
	F01Z510260-05	OUTLET PIPE	JIE-4JJ	C	BOSCH/Customer
	变更前				
变更描述	变更后				
变更原因	进气端锥旋转，方便客户拆T6。进气管位置微调，同时增加工艺定位孔				
风险点 (影响)	机械强度不足				
验证方法	FEA仿真后，结果均小于更改前数据，评估无影响				



PDEC R 25-032

零件号		零件名称	Project	样件阶段	变更来源
F01ZH003EB-05		铭牌	JIE-4JU	C	BOSCH/Customer
变更前			变更后		
变更描述					
变更原因	弗吉亚工厂, 铭牌为保温壳供应商打刻, 位置需要更新, 铭牌内容需要更新				
风险点 (影响)	铭牌位置更改客户不同意				
验证方法	已沟通客户, 客户认可。同493项目				

ATS C Sample initial release precondition

C Sample Drawing initial Release Checklist

C Sample Drawing Release Pre-condition Checklist		Result/Report	Status	Resp.	Date
Design	1. C Sample 3D model confirmed by customer?	OK	OK	张冲	2025.8.26
	2. C Sample offer drawing check with manufacturing drawing?				
	3. C Sample Nameplate confirmed by customer? Email or drawing confirm?				
	4. D-FMEA first version finished?				
	5. I-FMEA first version finished?				
	6. Installation guideline finished?				
	7. PSC/CC list finished for CMK summary?				
PUR/MOE	1. C Sample Make and Buy confirmed?	OK		李强	2025.8.26
	2. C sample DFMA welding process confirmed with MOE? Flow chart?				
	3. P-FMEA first version plan?				
DV Validation	1. Canning validation finished ? report?	OK	Done	Xu Run	2025.05.06
	2. ATS DV validation finished? report?	OK	Done	Xu Run	2025.05.06
System	1. TCD status?	OK	preliminary TCD done	李强	2025.05.06
	2. POC result & report ?	OK	OK completed		
